



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA



PROVINCIA DI
MATERA

PROGETTO UNIFICATO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Lavori di ampliamento per la costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio del liceo umanistico/musicale/coreutico "Pitagora" di Montalbano Jonico (MT).
C.U.P.: H31B21002120001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesco Tagliente

CRONOPROGRAMMA

ELABORATO 9.B

REDATTO DA:



COVING S.R.L.
SERVIZI DI INGEGNERIA E COSTRUZIONI

COVING S.R.L. - Servizi di Ingegneria
Via Nazario Sauro n. 102 - POTENZA (PZ)
P.IVA 02113980763
Via Nazario Sauro, 102 - 85100 Potenza

Legale Rappresentante
Dott. Ing. Giovanni Corallo

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Paolo Montanari

I PROGETTISTI

Ing. Veronica Radogna

Ing. Saverio Vizzo

Comune di Montalbano Jonico

Provincia di Matera

RELAZIONE PROGRAMMA ESECUTIVO

OGGETTO: Progetto unificato definitivo - esecutivo "Lavori di ampliamento per la costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio del liceo umanistico/musicale/coreutico "Pitagora" di Montalbano Jonico (MT)". (1° Stralcio)

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera nella persona del RUP Ing. Francesco Tagliente

Potenza, 22/06/2023

Il Tecnico
()

Comune di Montalbano Jonico

Provincia di Matera

- OGGETTO:** Progetto unificato definitivo - esecutivo “Lavori di ampliamento per la costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l’agibilità e il diritto allo studio del liceo umanistico/musicale/coreutico “Pitagora” di Montalbano Jonico (MT)”. (1° Stralcio)
- COMMITTENTE:** Amministrazione Provinciale di Matera nella persona del RUP Ing. Francesco Tagliente
- IMPRESA:**

RELAZIONE PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Il PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI allegato alla presente relazione, prescritto dal capitolato speciale d'appalto, è stato redatto in ottemperanza al comma 10 dell'articolo 43 del D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Dai calcoli effettuati, tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole, è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **365** giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nella definizione della durata e della produttività delle attività si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

La disposizione delle attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione condiziona la reale produttività che l'impresa si vincola a tenere durante la realizzazione, per rispettare i tempi indicati.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal programma allegato verrà garantita, attraverso le risorse impegnate e l'organizzazione dei lavori, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 172'665,15 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 353'593,53 .

Tabella Certificati di Pagamento

Nel Capitolato Speciale d'Appalto è stato previsto che il pagamento delle rate di acconto verrà effettuato ogni volta che il credito dell'impresa raggiunge la cifra di euro 621'594,50. Si riportano in seguito l'elenco dei Certificati di Pagamento da emettere:

- **SAL** n. 1 alla data 06/03/2024 **Importo** euro 623'833,19 - **Progressivo** euro 623'833,19.
- **SAL** n. 2 alla data 02/07/2024 **Importo** euro 633'204,61 - **Progressivo** euro 1'257'037,80.
- **SAL** n. 3 alla data 01/10/2024 **Importo** euro 623'142,72 - **Progressivo** euro 1'880'180,52.
- **SAL** n. 4 alla data 28/11/2024 **Importo** euro 191'801,30 - **Progressivo** euro 2'071'981,82.

Potenza, 22/06/2023

Comune di Montalbano Jonico

Provincia di Matera

Cronoprogramma di PROGETTO


OGGETTO: Progetto unificato definitivo - esecutivo "Lavori di ampliamento per la costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio del liceo umanistico/musicale/coreutico "Pitagora" di Montalbano Jonico (MT)". (1° Stralcio)

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera nella persona del RUP Ing. Francesco Tagliente


Potenza, 22/06/2023


Il Tecnico
()

ID	Nome attivita'	Durata	Importo	Semestre 1					Semestre 2				
				s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	
1	Opere provvisionali	121 g	48'945,44										
2	Recinzioni di cantiere	2 g	3'164,00										
3	Barracamenti e apprestamenti di cantiere	3 g	24'849,96										
4	Ponteggi	25 g	20'931,48										
5	Scavi di fondazione	8 g	203'938,15										
6	Scavo di fondazione	8 g	203'938,15										
7	Realizzazione strutture	98 g	755'301,04										
8	Fondazioni e muri di sostegno	43 g	297'911,63										
9	Travi, pilastri e solaio piano terra e piano primo	37 g	301'219,07										
10	Coperture	14 g	156'170,34										
11	Edilizia	134 g	451'626,48										
12	Tamponature	17 g	71'620,63										
13	Coibentazioni	17 g	107'760,03										
14	Coperture	15 g	56'426,38										
15	Massetti	16 g	39'770,46										
16	Tramezzature	15 g	17'330,75										
17	Controsoffittature e contropareti	18 g	55'029,80										
18	Pavimenti e rivestimenti	15 g	66'785,18										
19	Stuccature e tinteggiature	25 g	36'903,25										
20	Infissi	104 g	124'056,85										
21	Infissi esterni	15 g	116'730,73										
22	Infissi interni	5 g	7'326,12										
23	Impianto idrico e servizi igienici	78 g	23'764,38										
24	Schermature di adduzione	11 g	4'727,08										
25	Sanitari	9 g	19'037,30										
26	Impianto antincendio	13 g	30'781,51										
27	Impianto antincendio	13 g	30'781,51										
28	Impianto elettrico	14 g	79'248,96										
29	Impianto elettrico	14 g	79'248,96										
30	Impianto fotovoltaico	20 g	73'125,00										
31	Impianto fotovoltaico	20 g	73'125,00										
32	Impianto termico	22 g	177'444,56										
33	Impianto termico	22 g	177'444,56										
34	Barriere architettoniche	12 g	42'000,00										

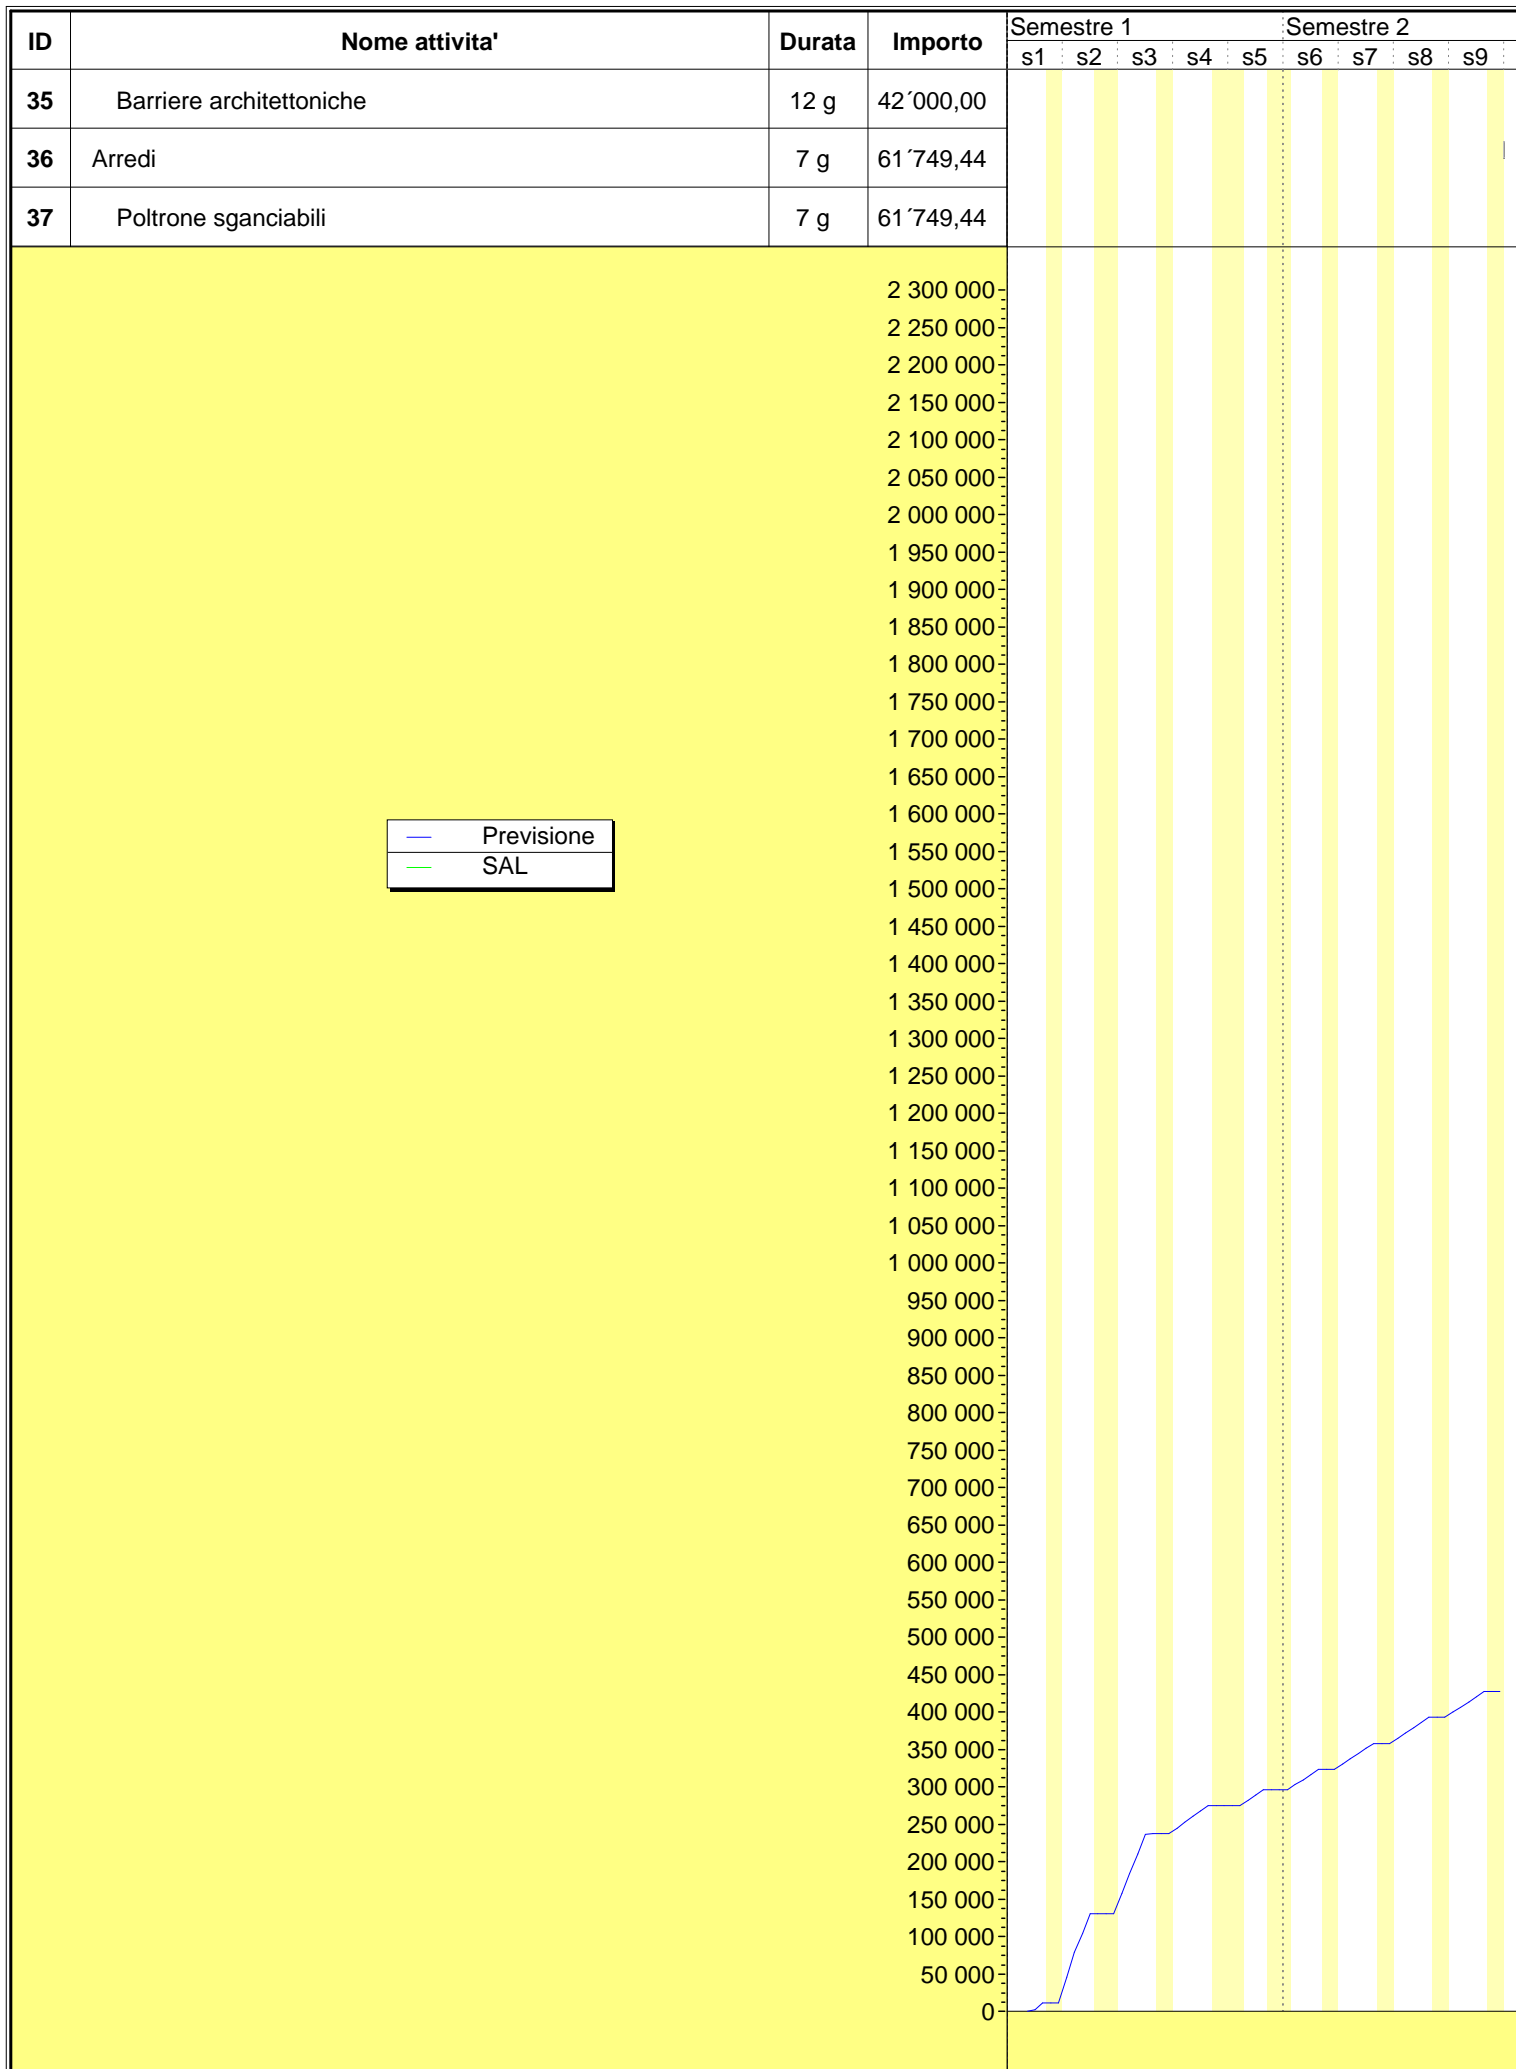



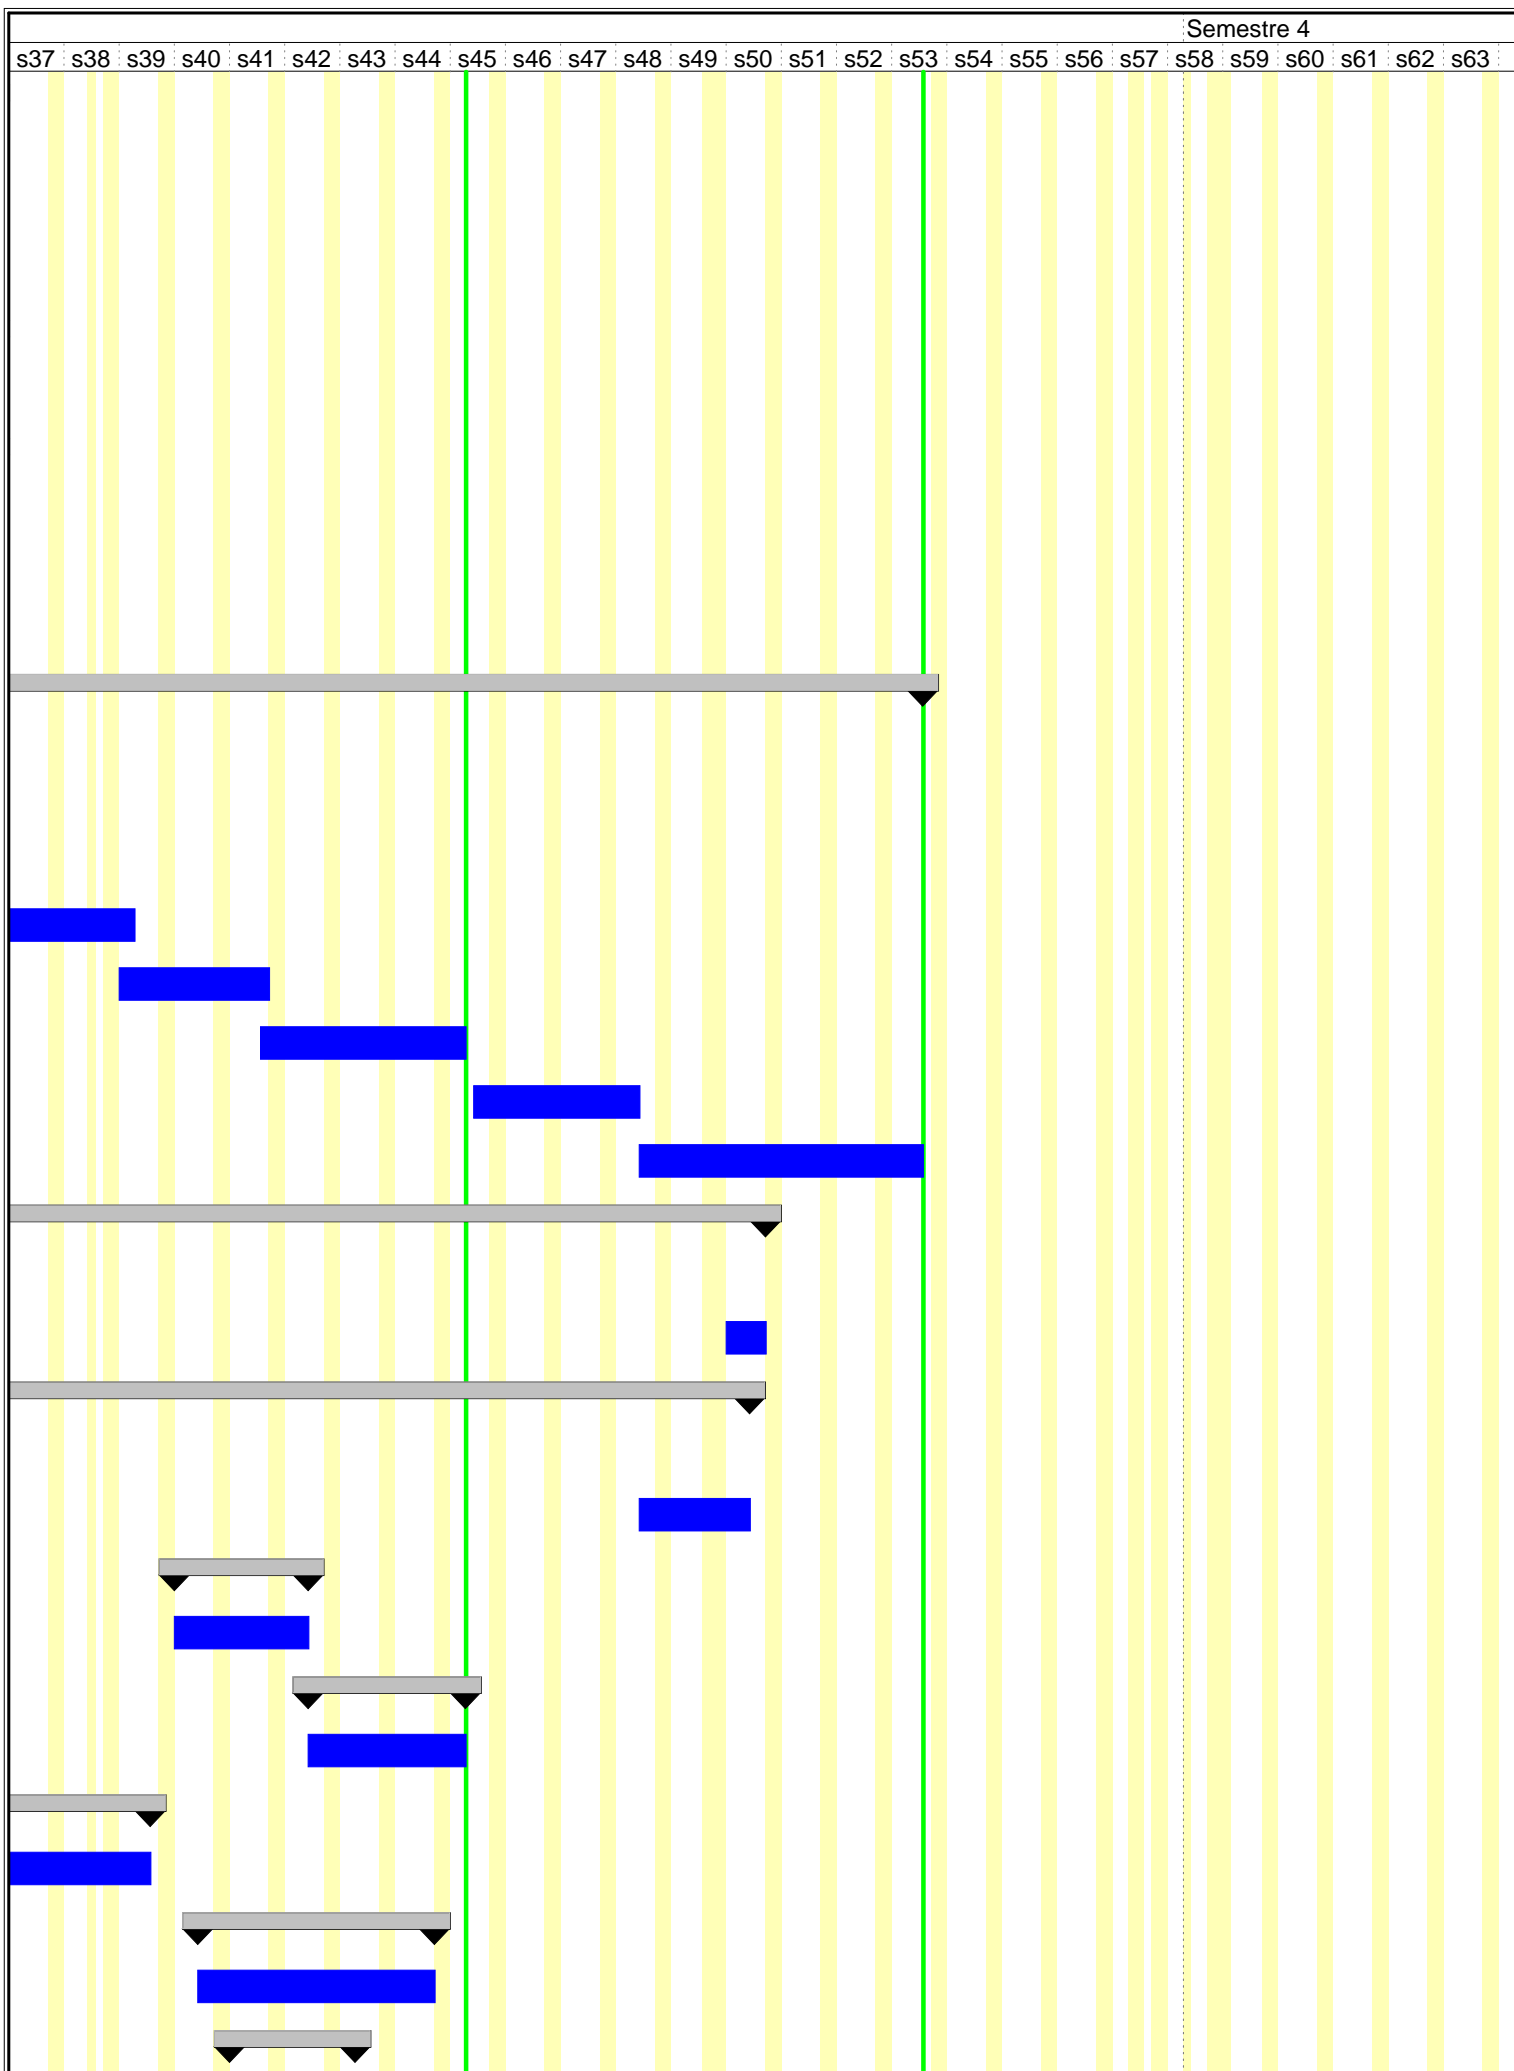

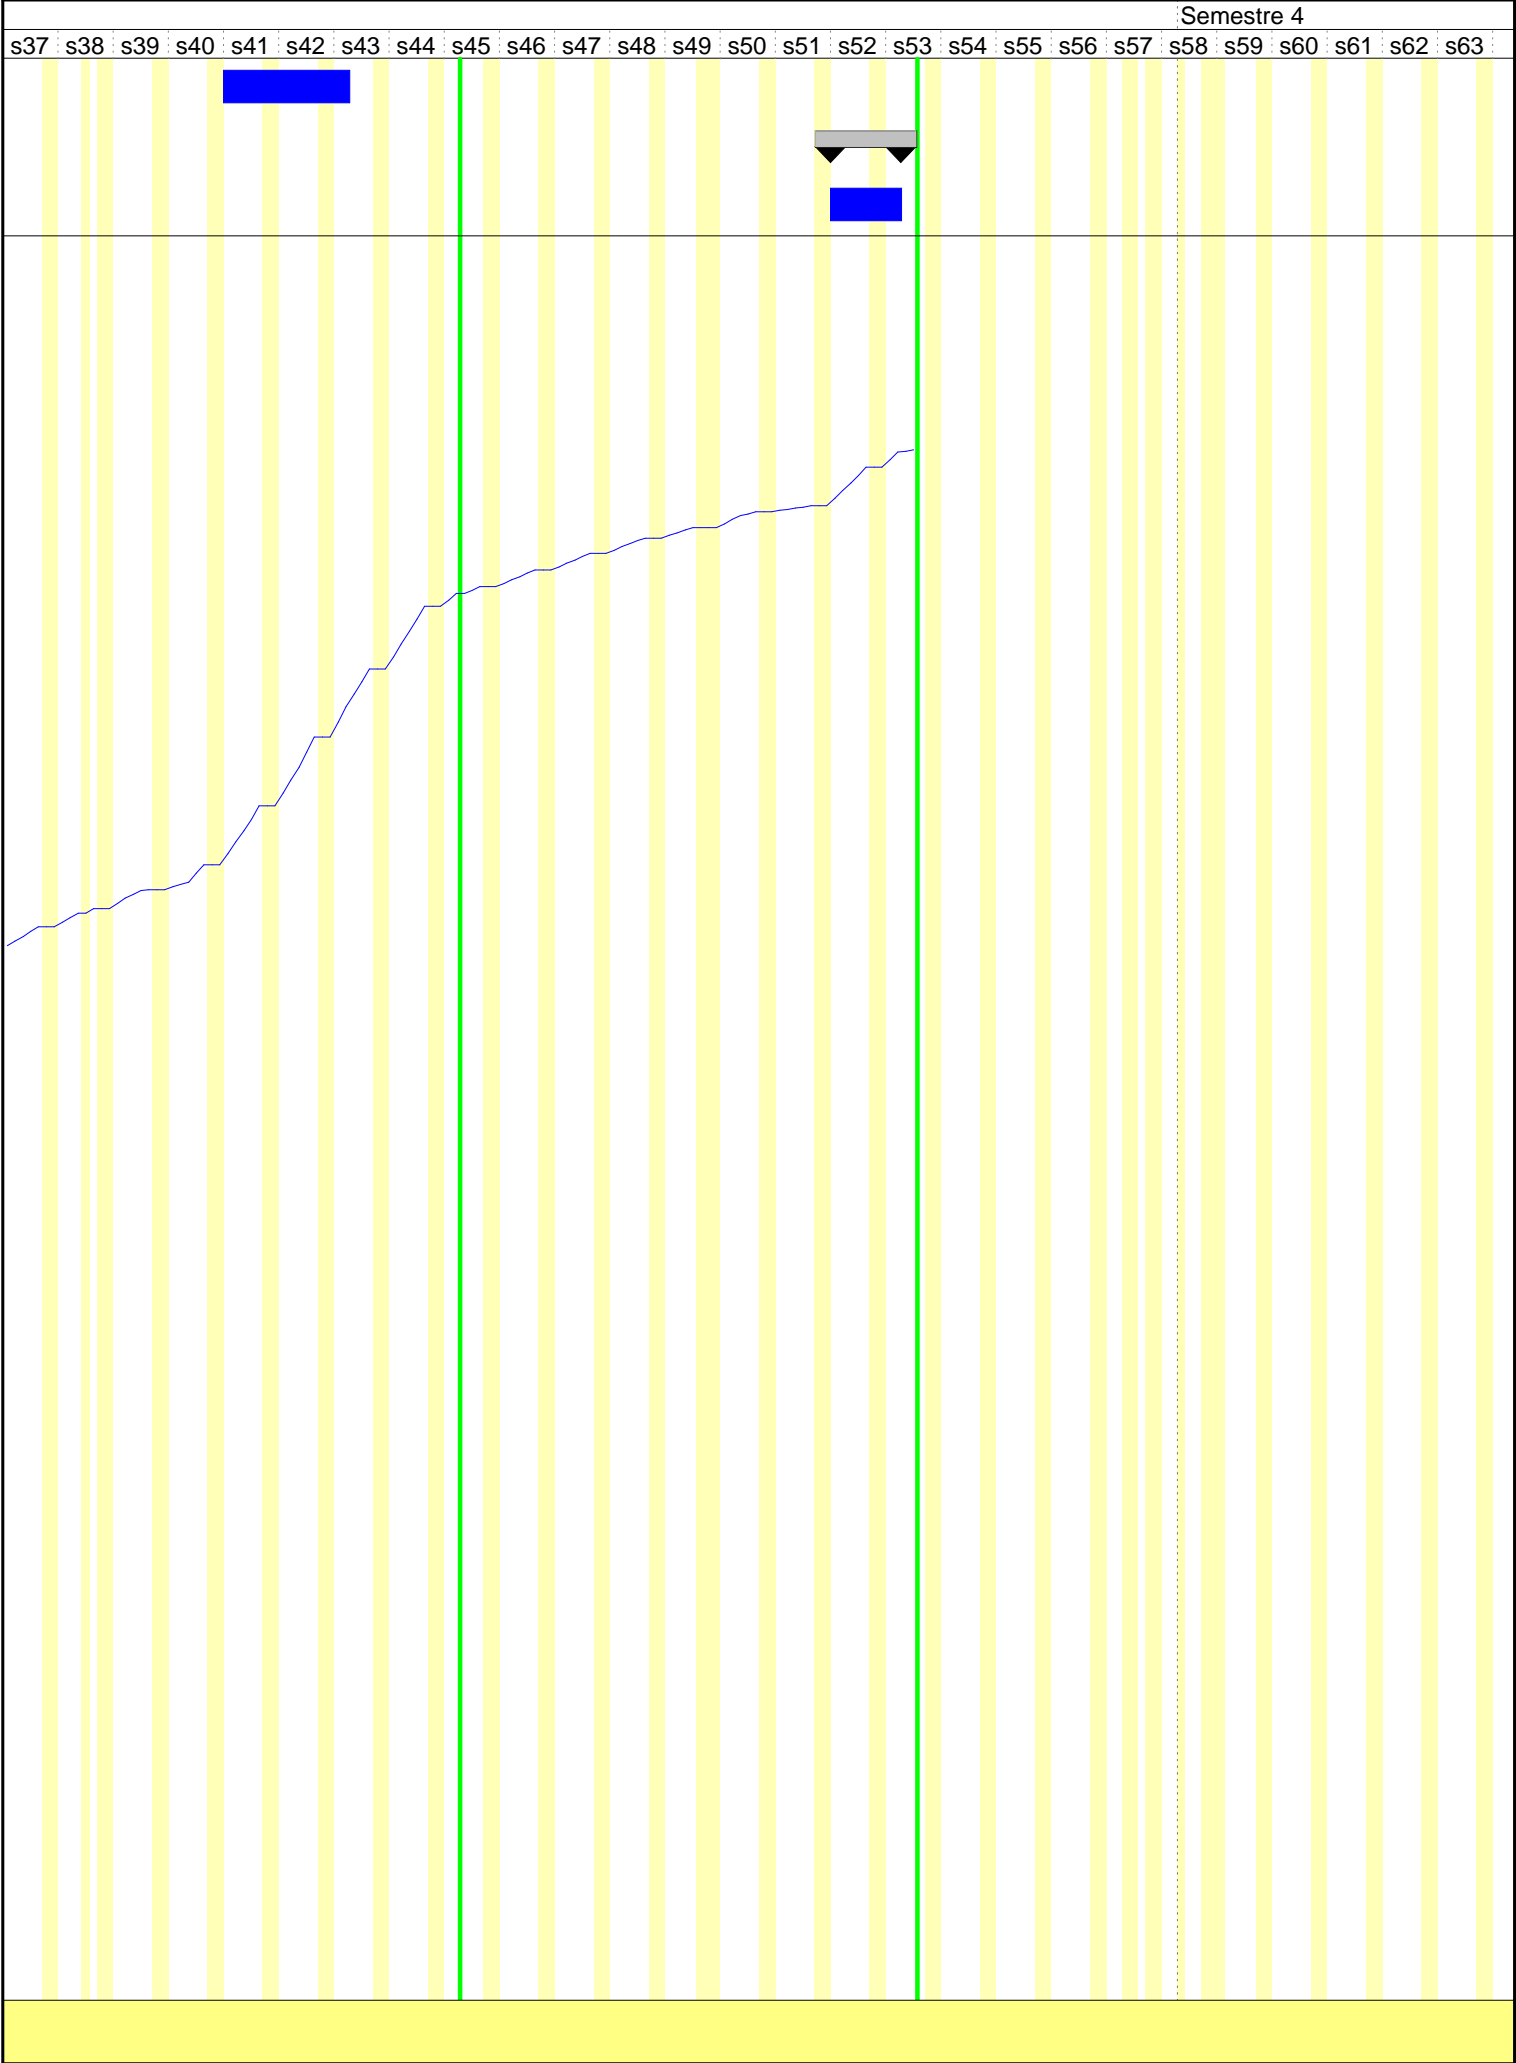

Comune di Montalbano Jonico

Provincia di Matera

Tabella Attività

OGGETTO: Progetto unificato definitivo - esecutivo "Lavori di ampliamento per la costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio del liceo umanistico/musicale/coreutico "Pitagora" di Montalbano Jonico (MT)". (1° Stralcio)

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera nella persona del RUP Ing. Francesco Tagliente

Potenza, 22/06/2023

Il Tecnico
()

--	--

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Opere provvisionali	48'945,44	2,362	1 gg	180 gg	121	180
* Recinzioni di cantiere	3'164,00	0,153	1 gg	2 gg	2	2
* Barraccamenti e apprestamenti di cantiere	24'849,96	1,199	2 gg	6 gg	3	5
* Ponteggi	20'931,48	1,010	8 gg	180 gg	25	36
* periodo 01	8'372,59	0,404	8 gg	22 gg	10	15
* periodo 02	4'186,30	0,202	84 gg	90 gg	5	7
* periodo 03	8'372,59	0,404	167 gg	180 gg	10	14
Scavi di fondazione	203'938,15	9,843	5 gg	15 gg	8	11
* Scavo di fondazione	203'938,15	9,843	5 gg	15 gg	8	11
Realizzazione strutture	755'301,04	36,453	19 gg	162 gg	98	144
* Fondazioni e muri di sostegno	297'911,63	14,378	19 gg	82 gg	43	64
* Travi, pilastri e solaio piano terra e piano primo	301'219,07	14,538	85 gg	138 gg	37	54
* Coperture	156'170,34	7,537	141 gg	162 gg	14	22
Edilizia	451'626,48	21,797	176 gg	365 gg	134	190
* Tamponature	71'620,63	3,457	176 gg	198 gg	17	23
* Coibentazioni	107'760,03	5,201	201 gg	223 gg	17	23
* Coperture	56'426,38	2,723	222 gg	240 gg	15	19
* Massetti	39'770,46	1,919	243 gg	265 gg	16	23
* Tramezzature	17'330,75	0,836	264 gg	282 gg	15	19
* Controsoffittature e contropareti	55'029,80	2,656	282 gg	307 gg	18	26
* Pavimenti e rivestimenti	66'785,18	3,223	309 gg	329 gg	15	21
* Stuccature e tinteggiature	36'903,25	1,781	330 gg	365 gg	25	36
Infissi	124'056,85	5,987	198 gg	345 gg	104	148
* Infissi esterni	116'730,73	5,634	198 gg	218 gg	15	21
* Infissi interni	7'326,12	0,354	341 gg	345 gg	5	5
Impianto idrico e servizi igienici	23'764,38	1,147	232 gg	343 gg	78	112
* Schermature di adduzione	4'727,08	0,228	232 gg	246 gg	11	15
* Sanitari	19'037,30	0,919	330 gg	343 gg	9	14
Impianto antincendio	30'781,51	1,486	271 gg	287 gg	13	17
* Impianto antincendio	30'781,51	1,486	271 gg	287 gg	13	17
Impianto elettrico	79'248,96	3,825	288 gg	307 gg	14	20
* Impianto elettrico	79'248,96	3,825	288 gg	307 gg	14	20
Impianto fotovoltaico	73'125,00	3,529	239 gg	267 gg	20	29
* Impianto fotovoltaico	73'125,00	3,529	239 gg	267 gg	20	29

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Impianto termico	177'444,56	8,564	274 gg	303 gg	22	30
* Impianto termico	177'444,56	8,564	274 gg	303 gg	22	30
Barriere architettoniche	42'000,00	2,027	278 gg	293 gg	12	16
* Barriere architettoniche	42'000,00	2,027	278 gg	293 gg	12	16
Arredi	61'749,44	2,980	355 gg	363 gg	7	9
* Poltrone sganciabili	61'749,44	2,980	355 gg	363 gg	7	9
Potenza, 22/06/2023						
Tecnico						

Comune di Montalbano Jonico

Provincia di Matera

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Progetto unificato definitivo - esecutivo "Lavori di ampliamento per la costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio del liceo umanistico/musicale/coreutico "Pitagora" di Montalbano Jonico (MT)". (1° Stralcio)

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera nella persona del RUP Ing. Francesco Tagliente

Potenza, 22/06/2023

Il Tecnico
()

--	--

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
1 gg	1'582,00	1'582,00	0,076
2 gg	9'865,32	11'447,32	0,552
5 gg	33'775,59	45'222,91	2,183
6 gg	33'775,59	78'998,50	3,813
7 gg	25'492,27	104'490,77	5,043
8 gg	26'329,53	130'820,29	6,314
12 gg	26'329,53	157'149,82	7,585
13 gg	26'329,53	183'479,35	8,855
14 gg	26'329,53	209'808,88	10,126
15 gg	26'329,53	236'138,41	11,397
16 gg	837,26	236'975,67	11,437
19 gg	7'765,44	244'741,10	11,812
20 gg	7'765,44	252'506,54	12,187
21 gg	7'765,44	260'271,98	12,561
22 gg	7'765,44	268'037,41	12,936
23 gg	6'928,18	274'965,59	13,271
28 gg	6'928,18	281'893,77	13,605
29 gg	6'928,18	288'821,95	13,939
30 gg	6'928,18	295'750,12	14,274
34 gg	6'928,18	302'678,30	14,608
35 gg	6'928,18	309'606,48	14,943
36 gg	6'928,18	316'534,66	15,277
37 gg	6'928,18	323'462,83	15,611
40 gg	6'928,18	330'391,01	15,946
41 gg	6'928,18	337'319,19	16,280
42 gg	6'928,18	344'247,36	16,614
43 gg	6'928,18	351'175,54	16,949
44 gg	6'928,18	358'103,72	17,283
47 gg	6'928,18	365'031,90	17,618
48 gg	6'928,18	371'960,07	17,952
49 gg	6'928,18	378'888,25	18,286
50 gg	6'928,18	385'816,43	18,621
51 gg	6'928,18	392'744,61	18,955
54 gg	6'928,18	399'672,78	19,289
55 gg	6'928,18	406'600,96	19,624
56 gg	6'928,18	413'529,14	19,958
57 gg	6'928,18	420'457,32	20,293
58 gg	6'928,18	427'385,49	20,627
61 gg	6'928,18	434'313,67	20,961
62 gg	6'928,18	441'241,85	21,296
63 gg	6'928,18	448'170,03	21,630
64 gg	6'928,18	455'098,20	21,964
65 gg	6'928,18	462'026,38	22,299
68 gg	6'928,18	468'954,56	22,633
69 gg	6'928,18	475'882,74	22,968
70 gg	6'928,18	482'810,91	23,302
71 gg	6'928,18	489'739,09	23,636
72 gg	6'928,18	496'667,27	23,971
75 gg	6'928,18	503'595,45	24,305
76 gg	6'928,18	510'523,62	24,639
77 gg	6'928,18	517'451,80	24,974
78 gg	6'928,18	524'379,98	25,308
79 gg	6'928,18	531'308,16	25,643
82 gg	6'928,18	538'236,34	25,977
84 gg	837,26	539'073,60	26,017
85 gg	8'978,32	548'051,91	26,451
86 gg	8'978,32	557'030,23	26,884
89 gg	8'978,32	566'008,54	27,317
90 gg	8'978,32	574'986,86	27,751
91 gg	8'141,06	583'127,91	28,143
92 gg	8'141,06	591'268,97	28,536
93 gg	8'141,06	599'410,02	28,929
96 gg	8'141,06	607'551,08	29,322
97 gg	8'141,06	615'692,14	29,715

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
98 gg	8'141,06	623'833,19	30,108
99 gg	8'141,06	631'974,25	30,501
100 gg	8'141,06	640'115,30	30,894
103 gg	8'141,06	648'256,36	31,287
104 gg	8'141,06	656'397,42	31,680
105 gg	8'141,06	664'538,47	32,073
106 gg	8'141,06	672'679,53	32,466
107 gg	8'141,06	680'820,58	32,858
110 gg	8'141,06	688'961,64	33,251
111 gg	8'141,06	697'102,69	33,644
112 gg	8'141,06	705'243,75	34,037
113 gg	8'141,06	713'384,81	34,430
114 gg	8'141,06	721'525,86	34,823
117 gg	8'141,06	729'666,92	35,216
118 gg	8'141,06	737'807,97	35,609
119 gg	8'141,06	745'949,03	36,002
120 gg	8'141,06	754'090,09	36,395
121 gg	8'141,06	762'231,14	36,788
125 gg	8'141,06	770'372,20	37,180
126 gg	8'141,06	778'513,25	37,573
127 gg	8'141,06	786'654,31	37,966
128 gg	8'141,06	794'795,37	38,359
131 gg	8'141,06	802'936,42	38,752
132 gg	8'141,06	811'077,48	39,145
133 gg	8'141,06	819'218,53	39,538
134 gg	8'141,06	827'359,59	39,931
135 gg	8'141,06	835'500,65	40,324
138 gg	8'141,06	843'641,71	40,717
141 gg	11'155,02	854'796,73	41,255
142 gg	11'155,02	865'951,75	41,793
145 gg	11'155,02	877'106,78	42,332
146 gg	11'155,02	888'261,80	42,870
147 gg	11'155,02	899'416,83	43,409
149 gg	11'155,02	910'571,85	43,947
152 gg	11'155,02	921'726,88	44,485
153 gg	11'155,02	932'881,90	45,024
155 gg	11'155,02	944'036,92	45,562
156 gg	11'155,02	955'191,95	46,100
159 gg	11'155,02	966'346,97	46,639
160 gg	11'155,02	977'502,00	47,177
161 gg	11'155,02	988'657,02	47,716
162 gg	11'155,02	999'812,04	48,254
167 gg	837,26	1'000'649,30	48,294
168 gg	837,26	1'001'486,56	48,335
169 gg	837,26	1'002'323,82	48,375
170 gg	837,26	1'003'161,08	48,416
173 gg	837,26	1'003'998,34	48,456
174 gg	837,26	1'004'835,60	48,496
175 gg	837,26	1'005'672,86	48,537
176 gg	5'050,24	1'010'723,09	48,781
177 gg	5'050,24	1'015'773,33	49,024
180 gg	5'050,24	1'020'823,57	49,268
181 gg	4'212,98	1'025'036,55	49,471
182 gg	4'212,98	1'029'249,53	49,675
183 gg	4'212,98	1'033'462,50	49,878
184 gg	4'212,98	1'037'675,48	50,081
187 gg	4'212,98	1'041'888,46	50,285
188 gg	4'212,98	1'046'101,44	50,488
189 gg	4'212,98	1'050'314,42	50,691
190 gg	4'212,98	1'054'527,39	50,895
191 gg	4'212,98	1'058'740,37	51,098
194 gg	4'212,98	1'062'953,35	51,301
195 gg	4'212,98	1'067'166,33	51,505
196 gg	4'212,98	1'071'379,31	51,708

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
197 gg	4'212,98	1'075'592,29	51,911
198 gg	11'995,03	1'087'587,31	52,490
201 gg	14'120,87	1'101'708,19	53,172
202 gg	14'120,87	1'115'829,06	53,853
203 gg	14'120,87	1'129'949,94	54,535
204 gg	14'120,87	1'144'070,81	55,216
205 gg	14'120,87	1'158'191,68	55,898
208 gg	14'120,87	1'172'312,56	56,579
209 gg	14'120,87	1'186'433,43	57,261
210 gg	14'120,87	1'200'554,31	57,942
211 gg	14'120,87	1'214'675,18	58,624
212 gg	14'120,87	1'228'796,05	59,305
215 gg	14'120,87	1'242'916,93	59,987
216 gg	14'120,87	1'257'037,80	60,668
217 gg	14'120,87	1'271'158,68	61,350
218 gg	14'120,88	1'285'279,55	62,031
219 gg	6'338,83	1'291'618,38	62,337
222 gg	10'100,58	1'301'718,96	62,825
223 gg	10'100,59	1'311'819,55	63,312
224 gg	3'761,76	1'315'581,31	63,494
225 gg	3'761,76	1'319'343,07	63,675
226 gg	3'761,76	1'323'104,83	63,857
229 gg	3'761,76	1'326'866,58	64,039
230 gg	3'761,76	1'330'628,34	64,220
231 gg	3'761,76	1'334'390,10	64,402
232 gg	4'191,49	1'338'581,59	64,604
233 gg	4'191,49	1'342'773,09	64,806
236 gg	4'191,49	1'346'964,58	65,009
237 gg	4'191,49	1'351'156,07	65,211
238 gg	4'191,49	1'355'347,57	65,413
239 gg	7'847,74	1'363'195,31	65,792
240 gg	7'847,74	1'371'043,06	66,171
243 gg	6'571,64	1'377'614,69	66,488
244 gg	6'571,64	1'384'186,33	66,805
245 gg	6'571,64	1'390'757,97	67,122
246 gg	6'571,63	1'397'329,60	67,439
247 gg	6'141,90	1'403'471,51	67,736
250 gg	6'141,90	1'409'613,41	68,032
251 gg	6'141,90	1'415'755,32	68,329
252 gg	6'141,90	1'421'897,22	68,625
253 gg	6'141,90	1'428'039,12	68,921
254 gg	6'141,90	1'434'181,03	69,218
257 gg	6'141,90	1'440'322,93	69,514
258 gg	6'141,90	1'446'464,83	69,811
259 gg	6'141,90	1'452'606,74	70,107
261 gg	6'141,90	1'458'748,64	70,404
264 gg	7'297,29	1'466'045,93	70,756
265 gg	7'297,28	1'473'343,21	71,108
266 gg	4'811,63	1'478'154,85	71,340
267 gg	4'811,63	1'482'966,48	71,572
268 gg	1'155,38	1'484'121,86	71,628
271 gg	3'523,19	1'487'645,05	71,798
272 gg	3'523,19	1'491'168,25	71,968
273 gg	3'523,19	1'494'691,44	72,138
274 gg	11'588,85	1'506'280,29	72,698
275 gg	11'588,85	1'517'869,14	73,257
278 gg	15'088,85	1'532'958,00	73,985
279 gg	15'088,85	1'548'046,85	74,713
280 gg	15'088,85	1'563'135,71	75,442
281 gg	15'088,85	1'578'224,56	76,170
282 gg	18'146,06	1'596'370,62	77,046
285 gg	16'990,68	1'613'361,30	77,866
286 gg	16'990,68	1'630'351,98	78,686
287 gg	16'990,68	1'647'342,67	79,506

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
288 gg	20'283,51	1'667'626,18	80,485
289 gg	20'283,51	1'687'909,69	81,464
292 gg	20'283,51	1'708'193,20	82,442
293 gg	20'283,51	1'728'476,72	83,421
294 gg	16'783,51	1'745'260,23	84,231
295 gg	16'783,51	1'762'043,74	85,041
296 gg	16'783,51	1'778'827,26	85,851
299 gg	16'783,51	1'795'610,77	86,662
300 gg	16'783,51	1'812'394,28	87,472
301 gg	16'783,51	1'829'177,80	88,282
302 gg	16'783,51	1'845'961,31	89,092
303 gg	16'783,51	1'862'744,82	89,902
306 gg	8'717,85	1'871'462,67	90,322
307 gg	8'717,85	1'880'180,52	90,743
309 gg	4'452,35	1'884'632,87	90,958
310 gg	4'452,35	1'889'085,21	91,173
313 gg	4'452,35	1'893'537,56	91,388
314 gg	4'452,35	1'897'989,90	91,603
315 gg	4'452,35	1'902'442,25	91,818
316 gg	4'452,35	1'906'894,59	92,032
317 gg	4'452,35	1'911'346,94	92,247
320 gg	4'452,35	1'915'799,28	92,462
321 gg	4'452,35	1'920'251,63	92,677
322 gg	4'452,35	1'924'703,97	92,892
323 gg	4'452,35	1'929'156,32	93,107
324 gg	4'452,35	1'933'608,66	93,322
327 gg	4'452,35	1'938'061,01	93,537
328 gg	4'452,35	1'942'513,36	93,751
329 gg	4'452,35	1'946'965,71	93,966
330 gg	3'591,39	1'950'557,09	94,140
331 gg	3'591,39	1'954'148,48	94,313
334 gg	3'591,39	1'957'739,86	94,486
335 gg	3'591,39	1'961'331,25	94,660
336 gg	3'591,39	1'964'922,63	94,833
337 gg	3'591,39	1'968'514,02	95,006
341 gg	5'056,61	1'973'570,63	95,250
342 gg	5'056,61	1'978'627,24	95,494
343 gg	5'056,61	1'983'683,85	95,738
344 gg	2'941,35	1'986'625,21	95,880
345 gg	2'941,35	1'989'566,56	96,022
348 gg	1'476,13	1'991'042,69	96,094
349 gg	1'476,13	1'992'518,82	96,165
350 gg	1'476,13	1'993'994,95	96,236
351 gg	1'476,13	1'995'471,08	96,307
352 gg	1'476,13	1'996'947,21	96,379
355 gg	10'297,48	2'007'244,68	96,876
356 gg	10'297,48	2'017'542,16	97,373
357 gg	10'297,48	2'027'839,64	97,870
358 gg	10'297,48	2'038'137,12	98,367
359 gg	10'297,48	2'048'434,60	98,864
362 gg	10'297,48	2'058'732,08	99,361
363 gg	10'297,48	2'069'029,56	99,858
364 gg	1'476,13	2'070'505,69	99,929
365 gg	1'476,13	2'071'981,82	100,000
Potenza, 22/06/2023			
Tecnico			

Comune di Montalbano Jonico

Provincia di Matera

Cronoprogramma di PROGETTO


OGGETTO: Progetto unificato definitivo - esecutivo "Lavori di ampliamento per la costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio del liceo umanistico/musicale/coreutico "Pitagora" di Montalbano Jonico (MT)". (Progetto)


COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera nella persona del RUP Ing. Francesco Tagliente


Potenza, 22/06/2023


Il Tecnico
()


ID	Nome attivita'	Durata	Importo	Semestre 1					Semestre 2				
				s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	
1	Opere provvisoriale	111 g	48'945,44										
2	Recinzioni di cantiere	2 g	3'164,00										
3	Barracamenti e apprestamenti di cantiere	3 g	24'849,96										
4	Ponteggi	25 g	20'931,48										
5	Scavi di fondazione	8 g	203'938,15										
6	Scavo di fondazione	8 g	203'938,15										
7	Realizzazione strutture	104 g	756'850,90										
8	Strutture	104 g	756'850,90										
9	Edilizia	246 g	805'786,61										
10	Massetti, tamponature, coibentazioni e coperture	153 g	338'696,84										
11	Tramazzature e finiture interne	98 g	467'089,77										
12	Infissi	28 g	140'660,45										
13	Infissi	28 g	140'660,45										
14	Impianto idrico e servizi igienici	9 g	43'201,19										
15	Impianto idrico e servizi igienici	9 g	43'201,19										
16	Impianto antincendio	25 g	44'090,07										
17	Impianto antincendio	25 g	44'090,07										
18	Impianto elettrico	32 g	163'242,14										
19	Impianto elettrico	32 g	163'242,14										
20	Impianto fotovoltaico	31 g	275'793,00										
21	Impianto fotovoltaico	31 g	275'793,00										
22	Impianto termico	42 g	289'245,64										
23	Impianto termico	42 g	289'245,64										
24	Barriere architettoniche	12 g	60'000,00										
25	Barriere architettoniche	12 g	60'000,00										
26	Arredi	7 g	168'238,03										
27	Arredi	7 g	168'238,03										
28	Impianto audio/video/luci	14 g	56'314,59										
29	Impianto audio/video/luci	14 g	56'314,59										
30	Sistemazione esterna	23 g	280'513,52										
31	Sistemazione esterna	23 g	280'513,52										

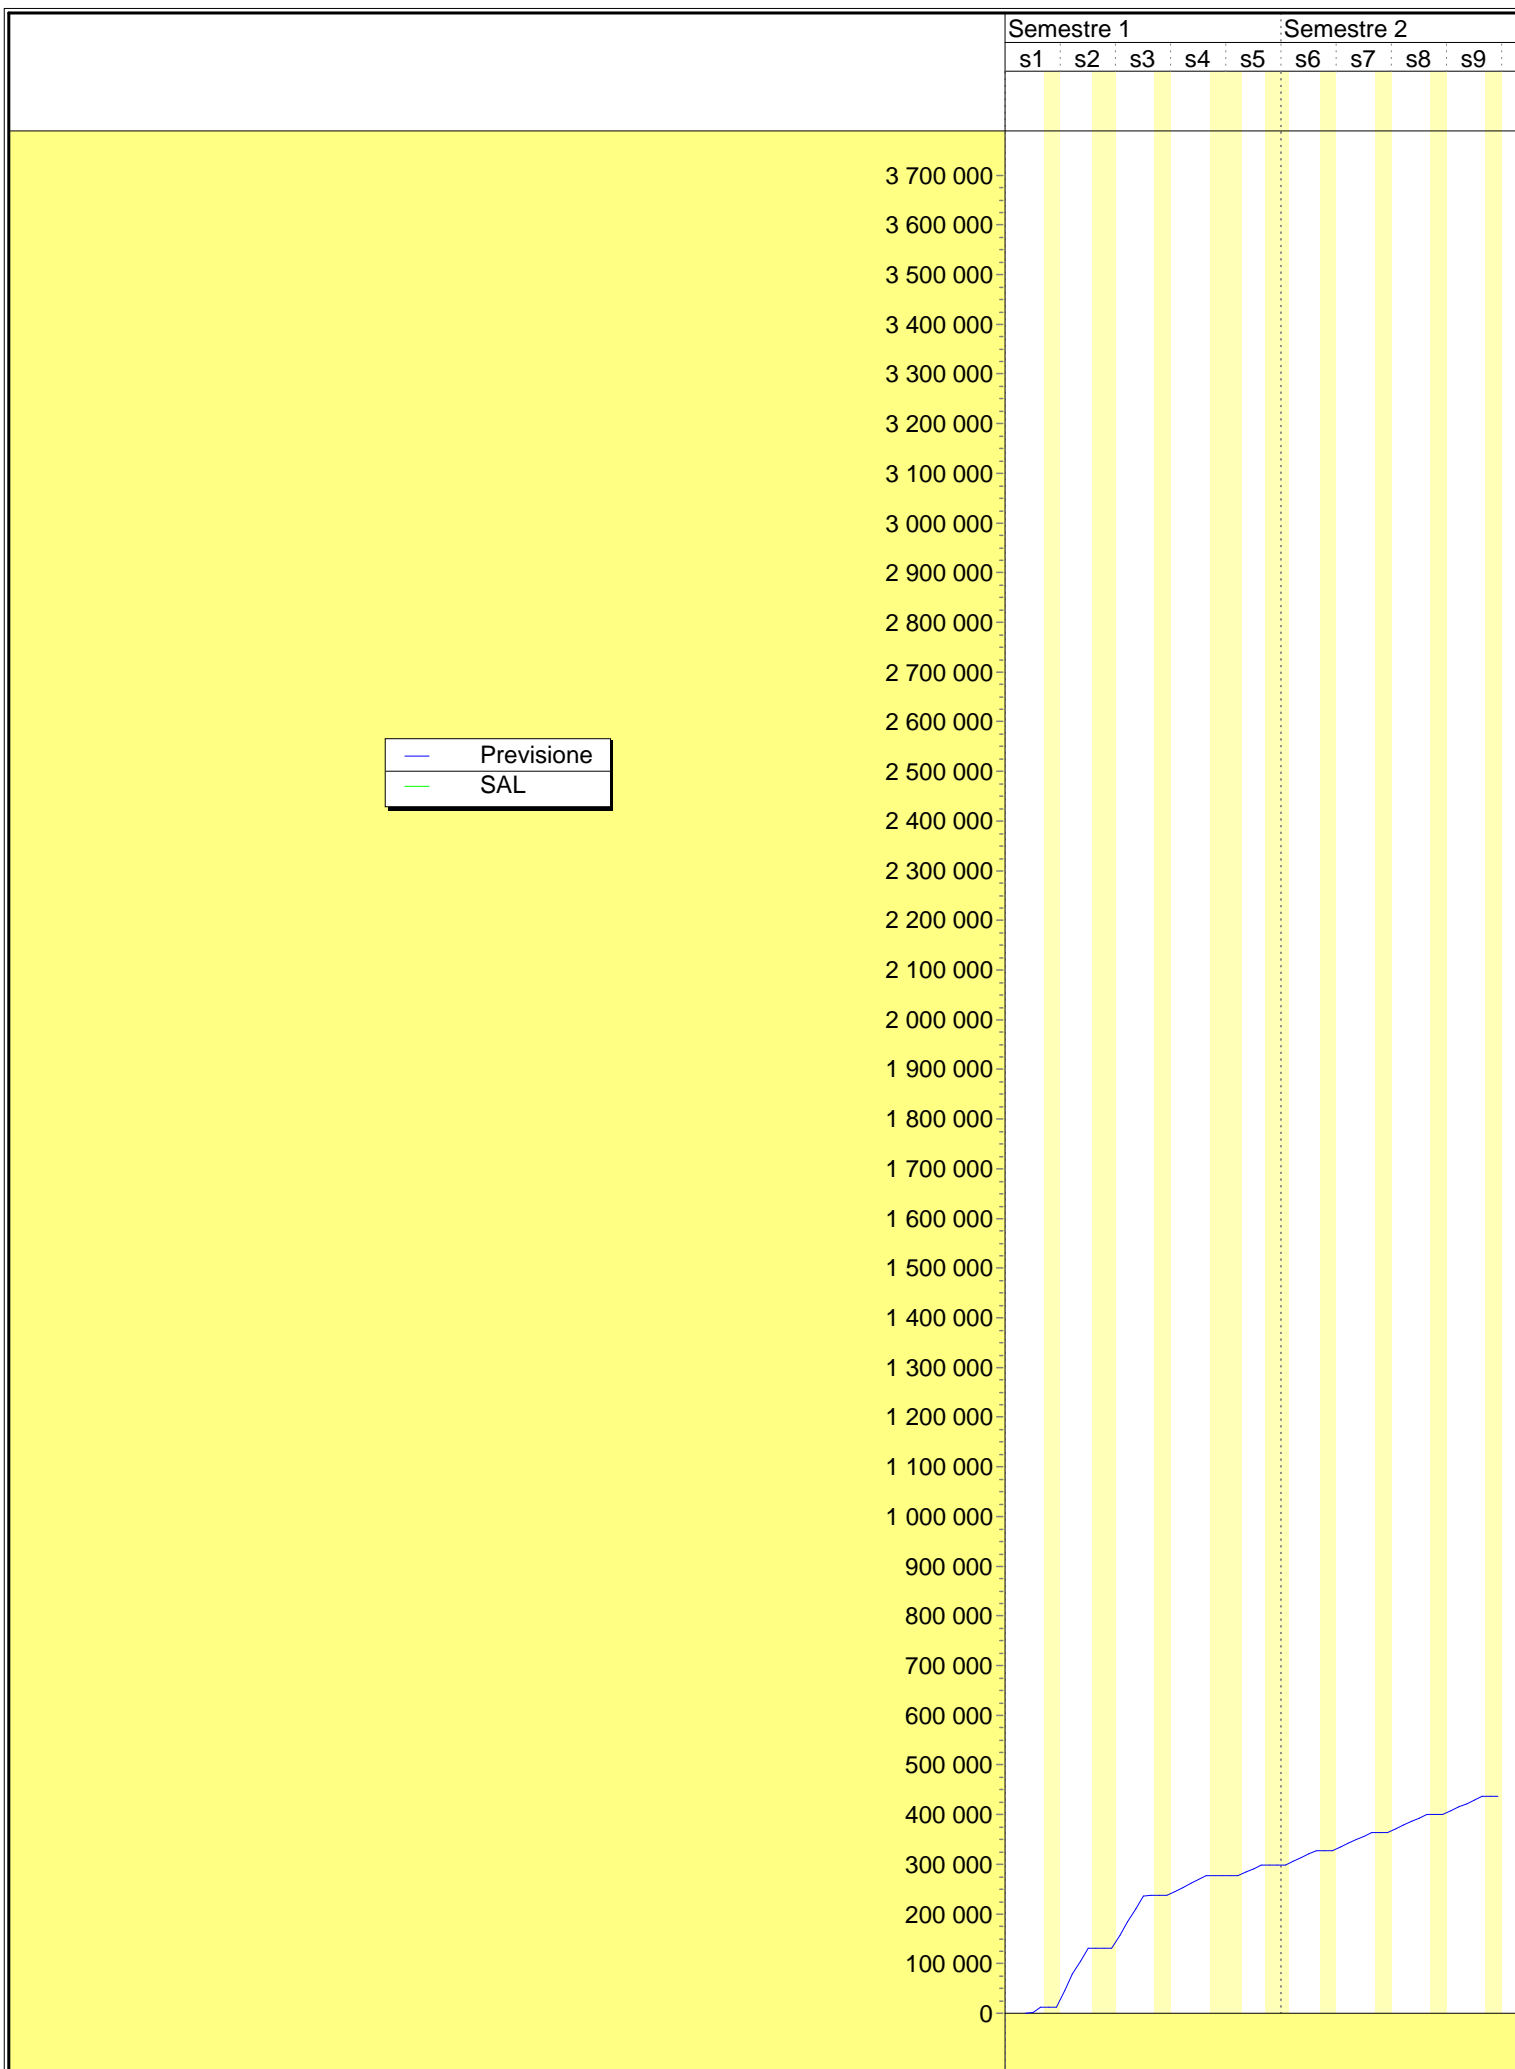

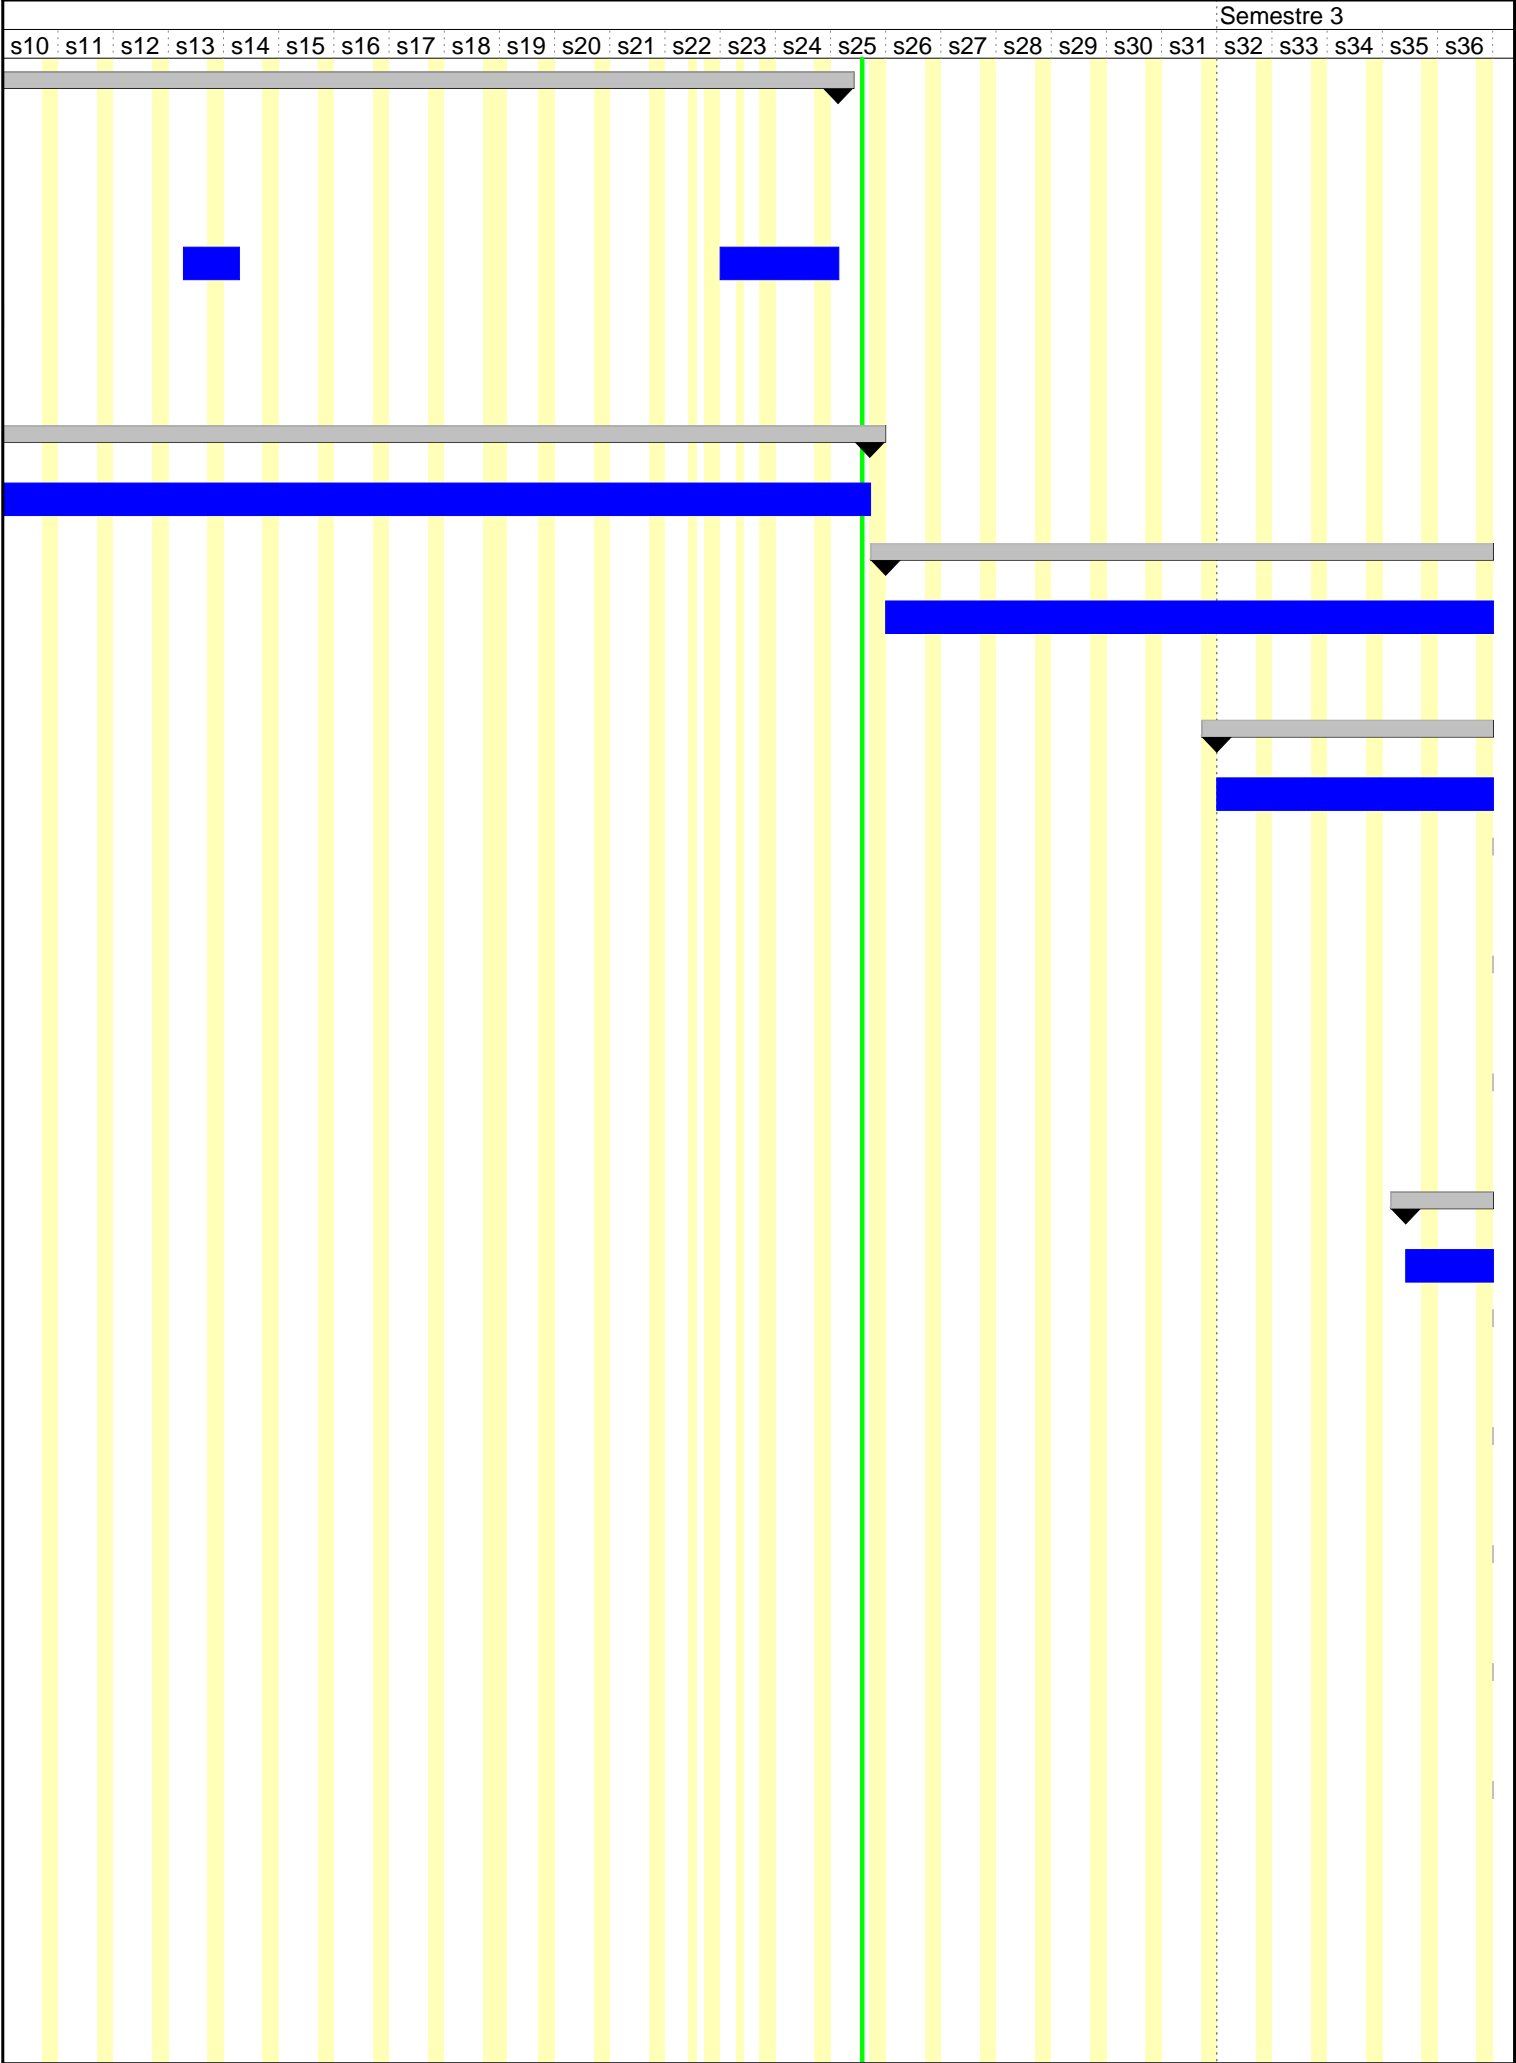

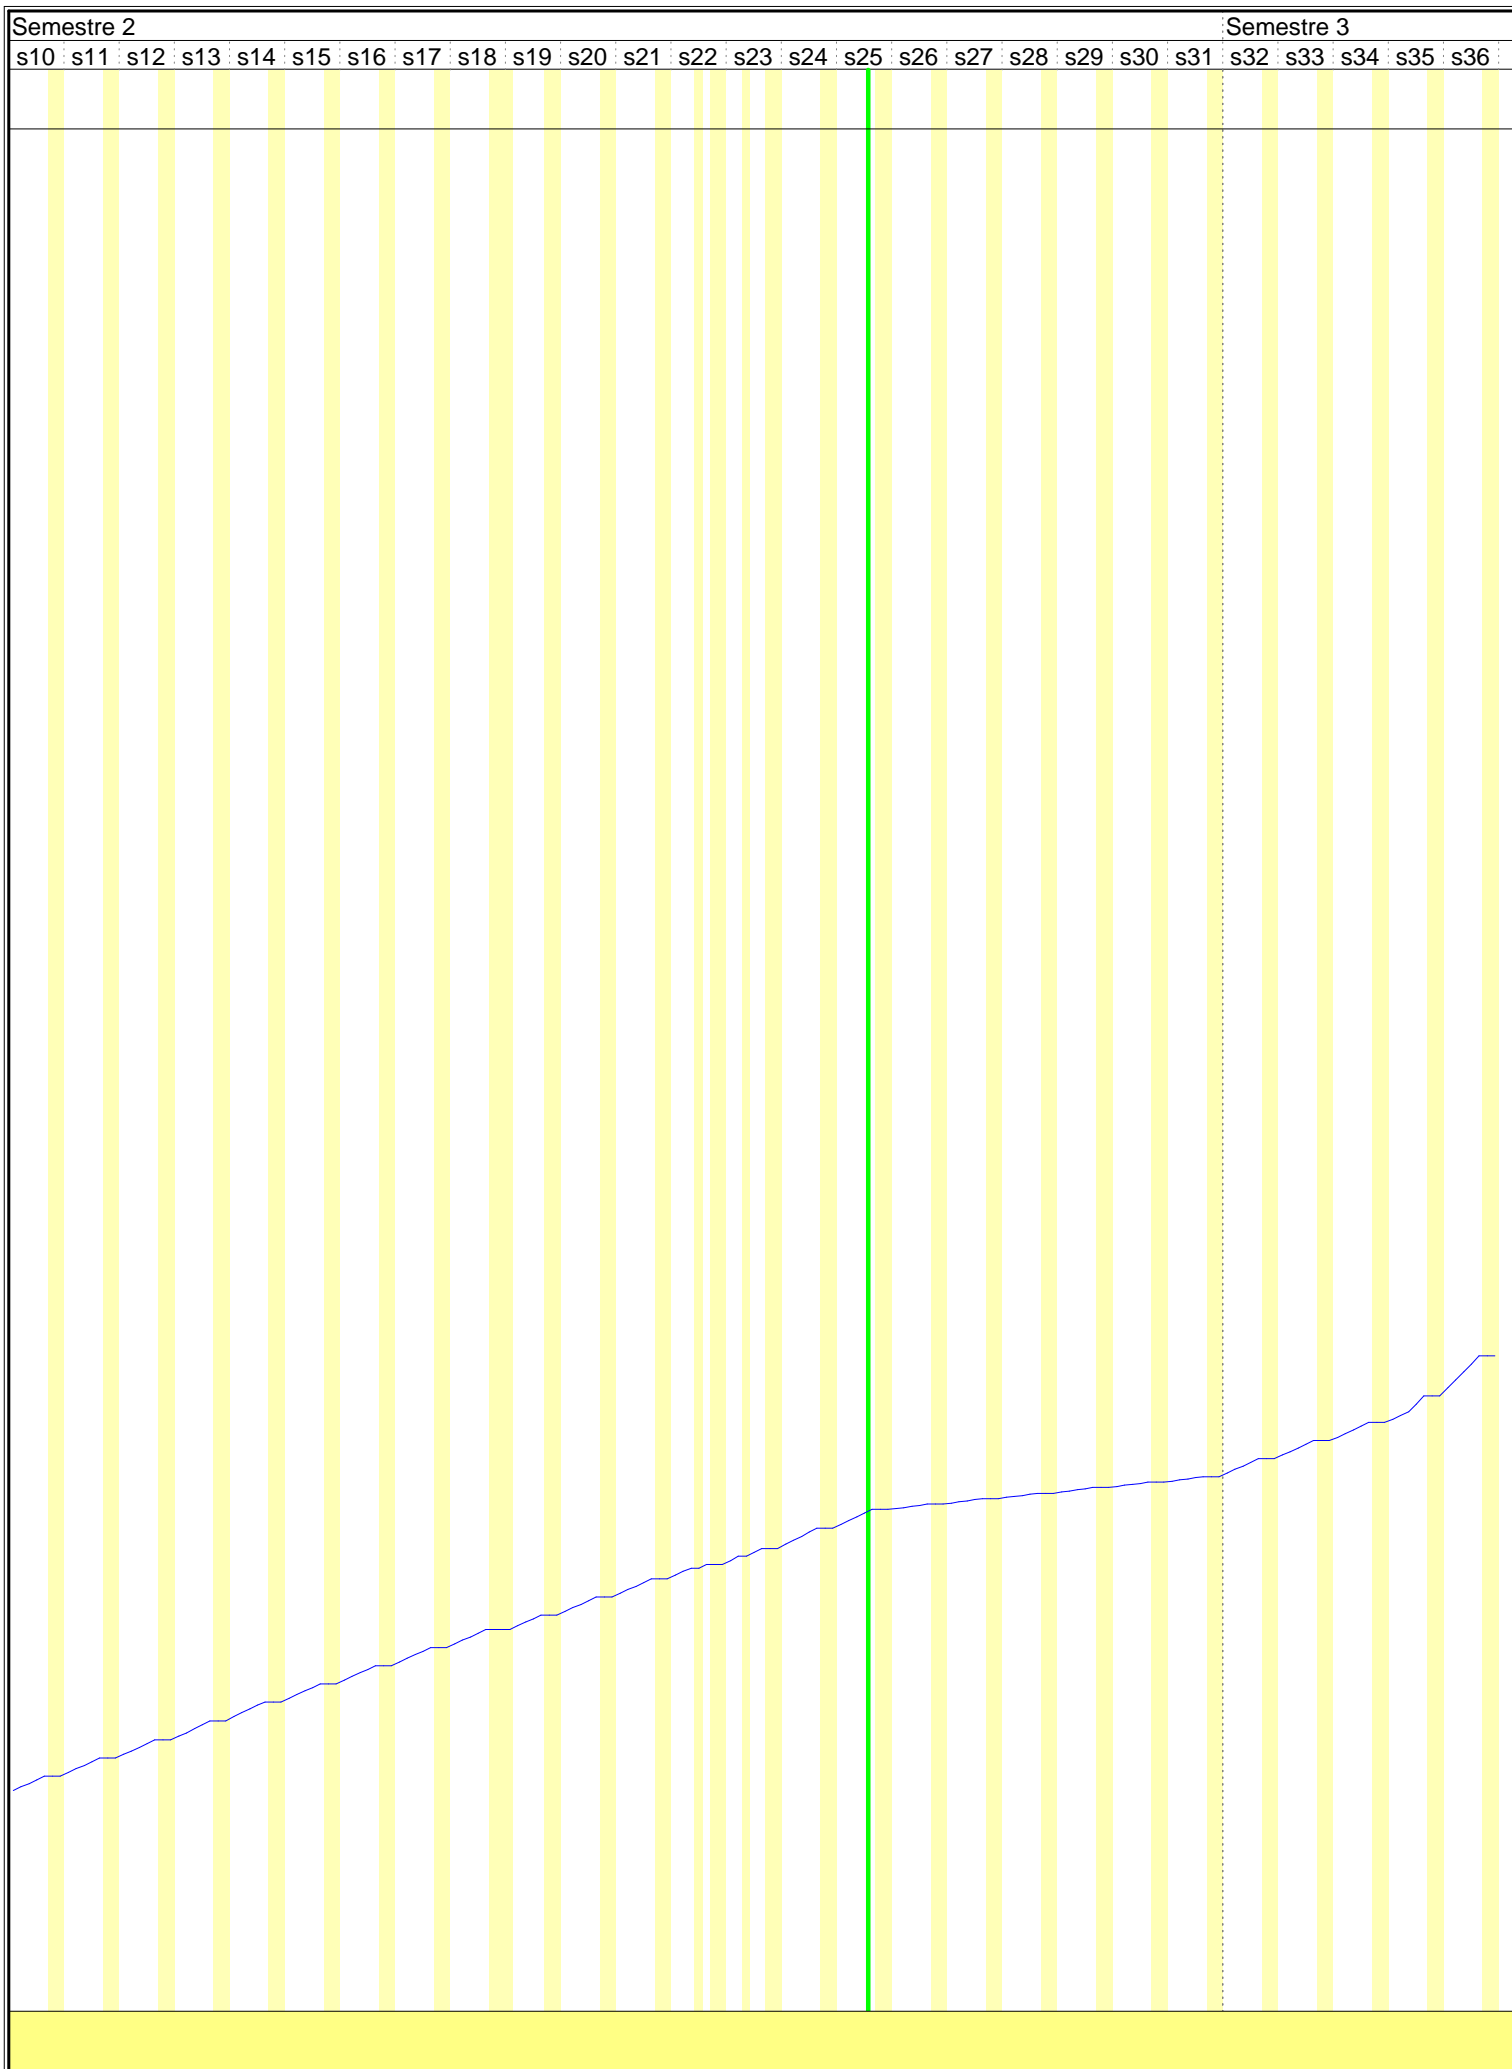

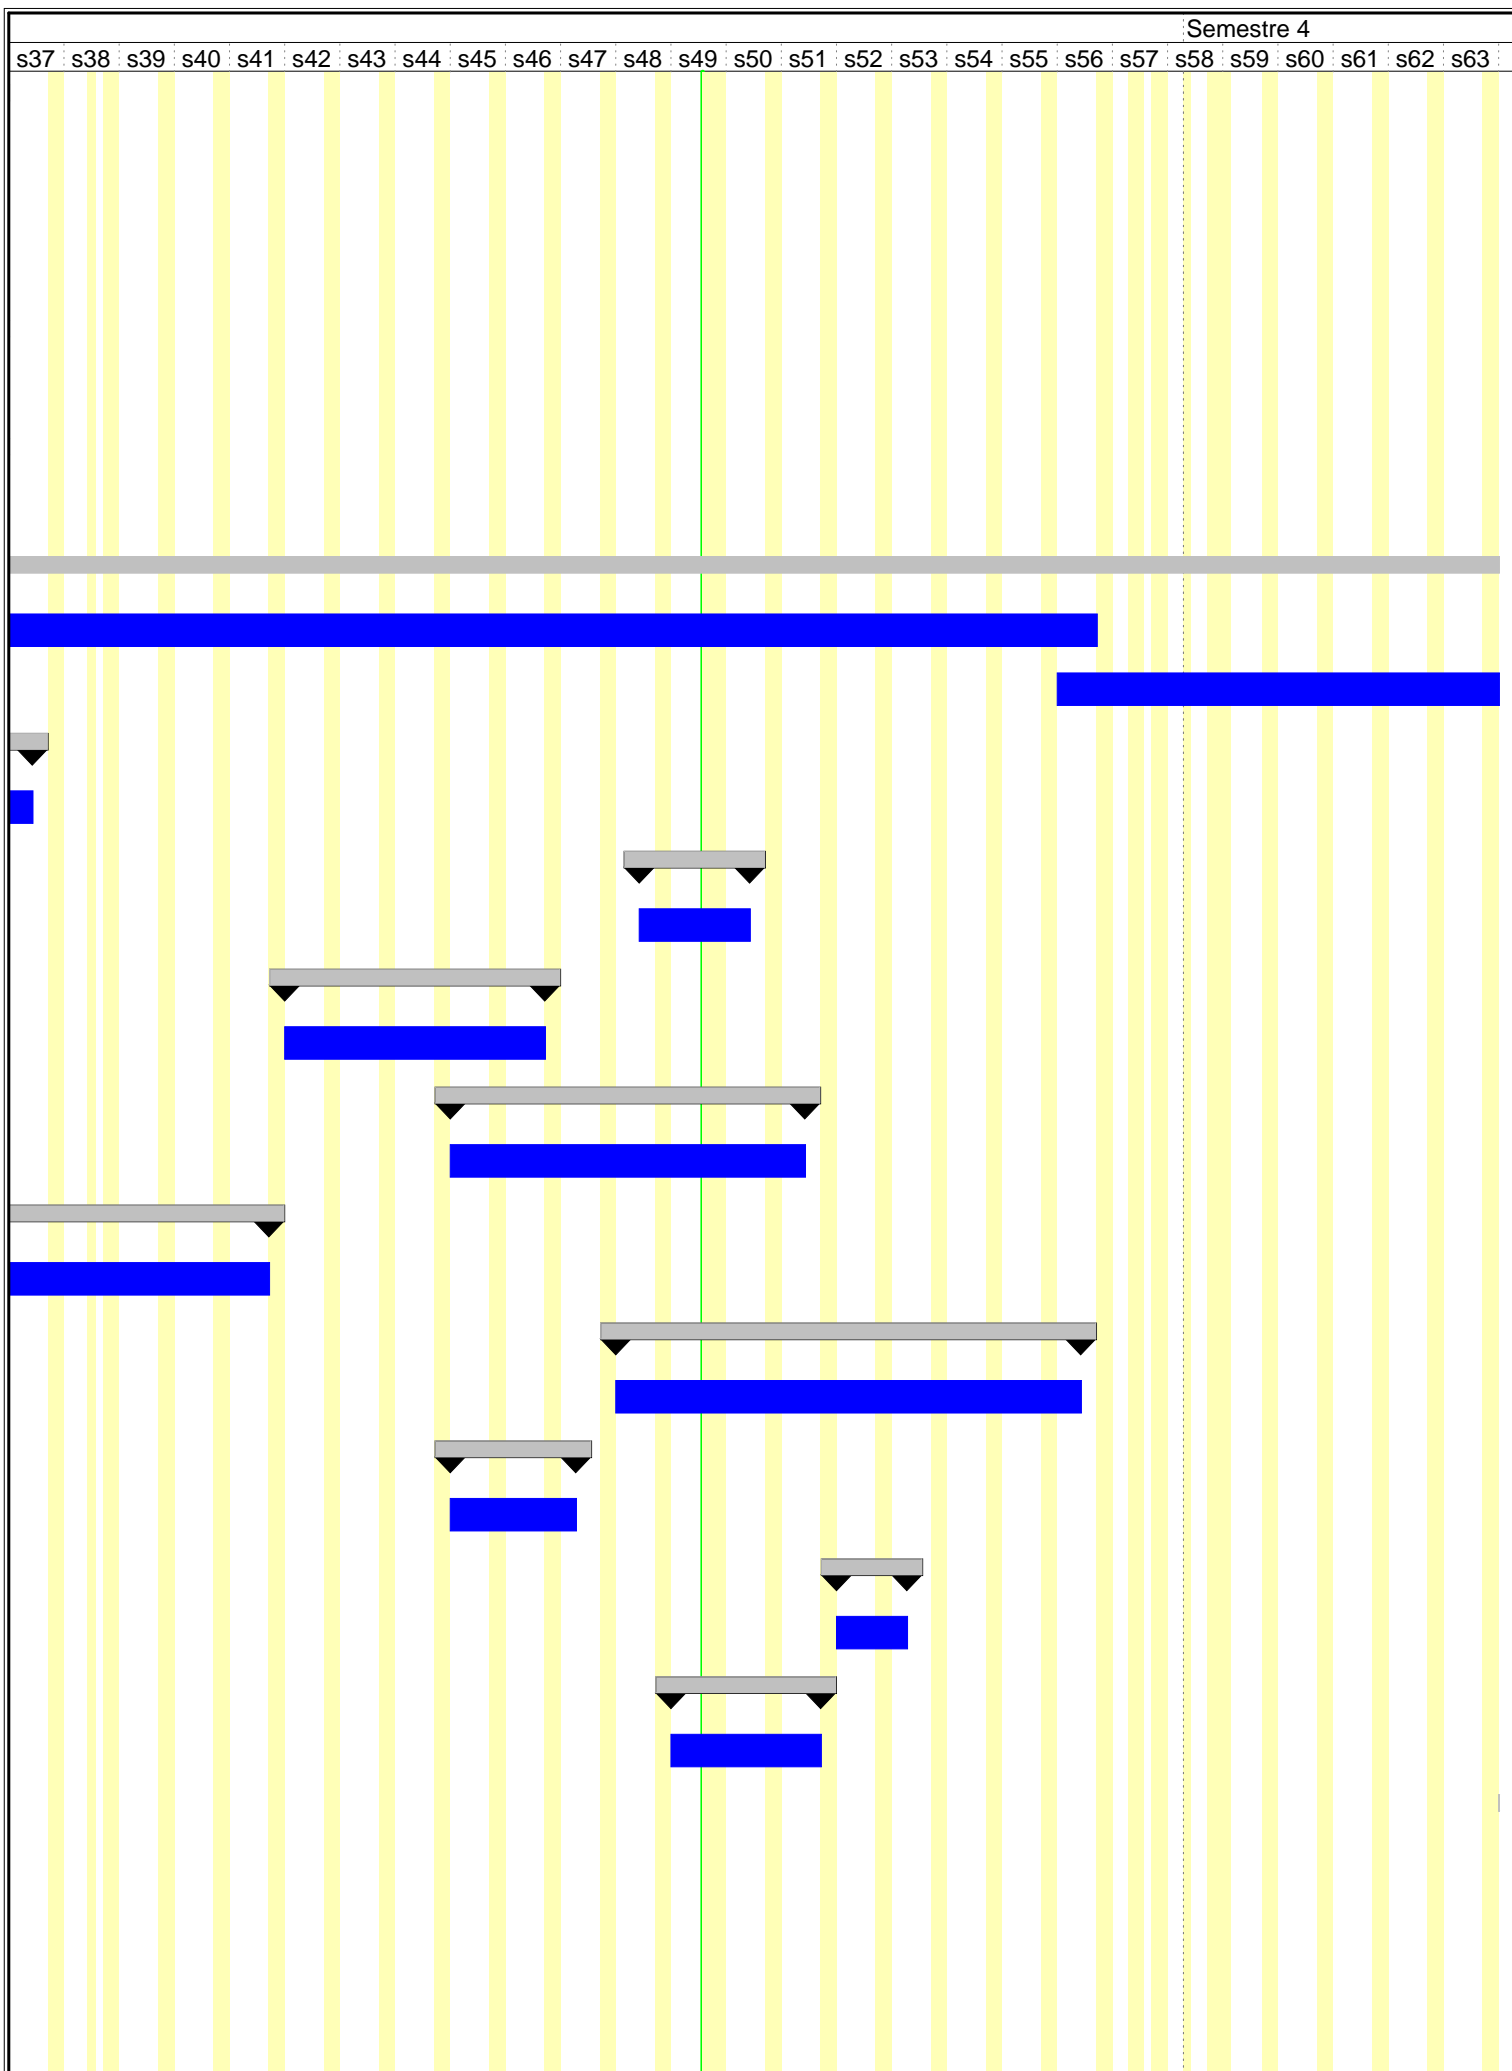

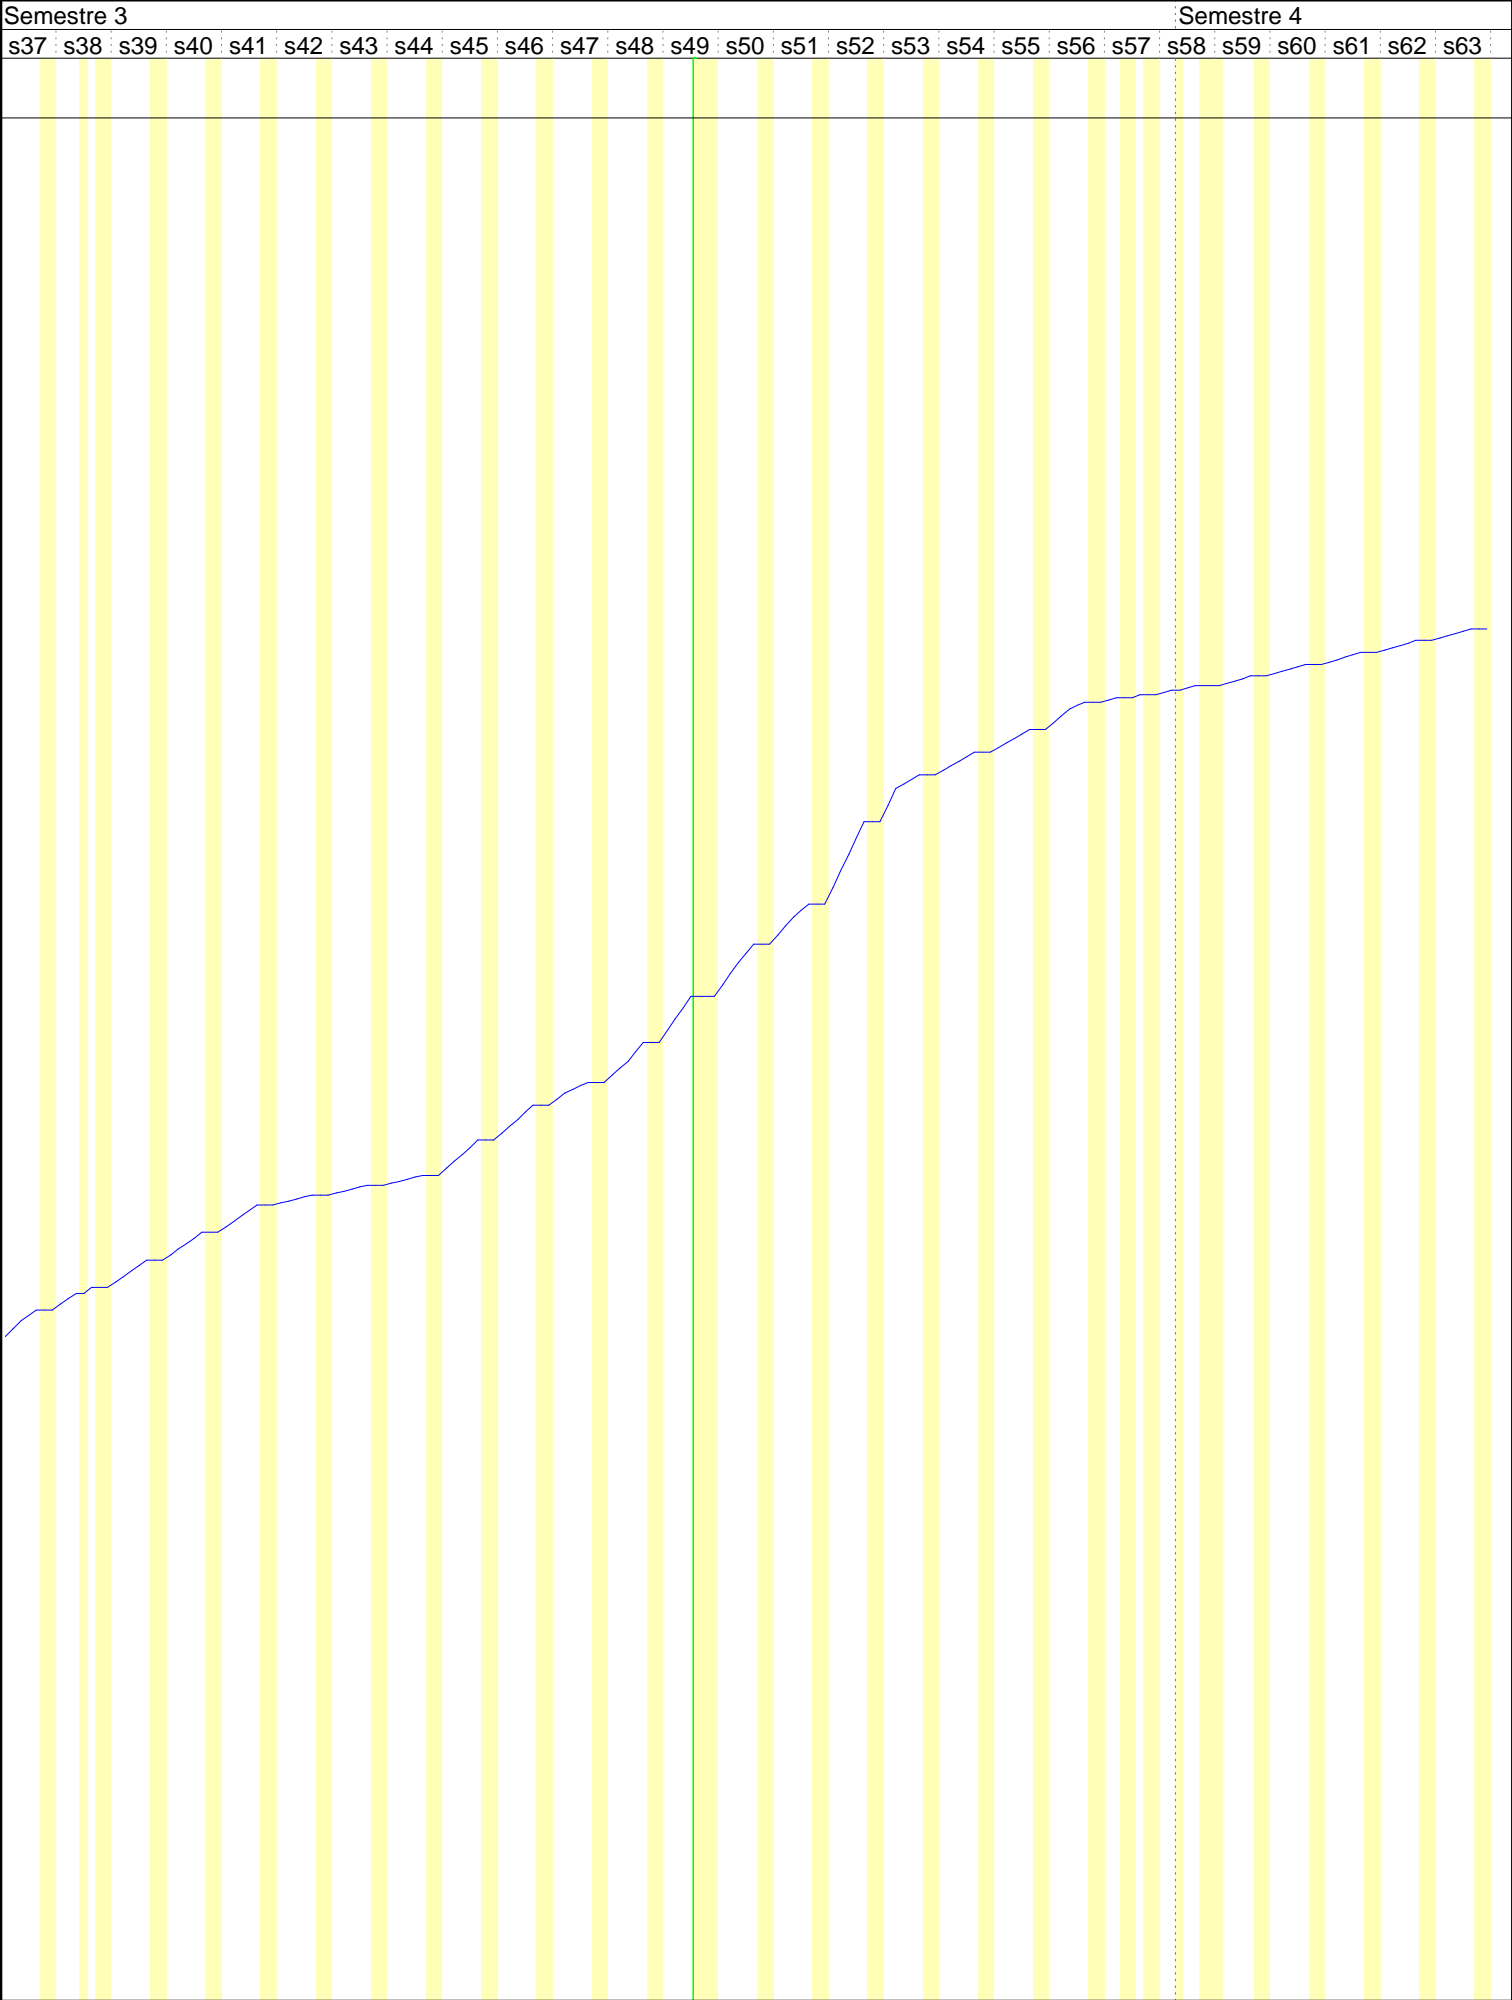

[illegible]

