




Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Art.1, comma 5, lettera e) del D.L. n.19 del 2 marzo 2024 convertito con L. 29 aprile 2024, n.56, giusta revisione dell'accordo di concessione di finanziamento sottoscritta per accettazione in data 12/11/2024 (ex PNRR Misura M5C3, Investimento 1, Linea di intervento 1.1.1).



COMUNE DI FERRANDINA
PROVINCIA DI MATERA

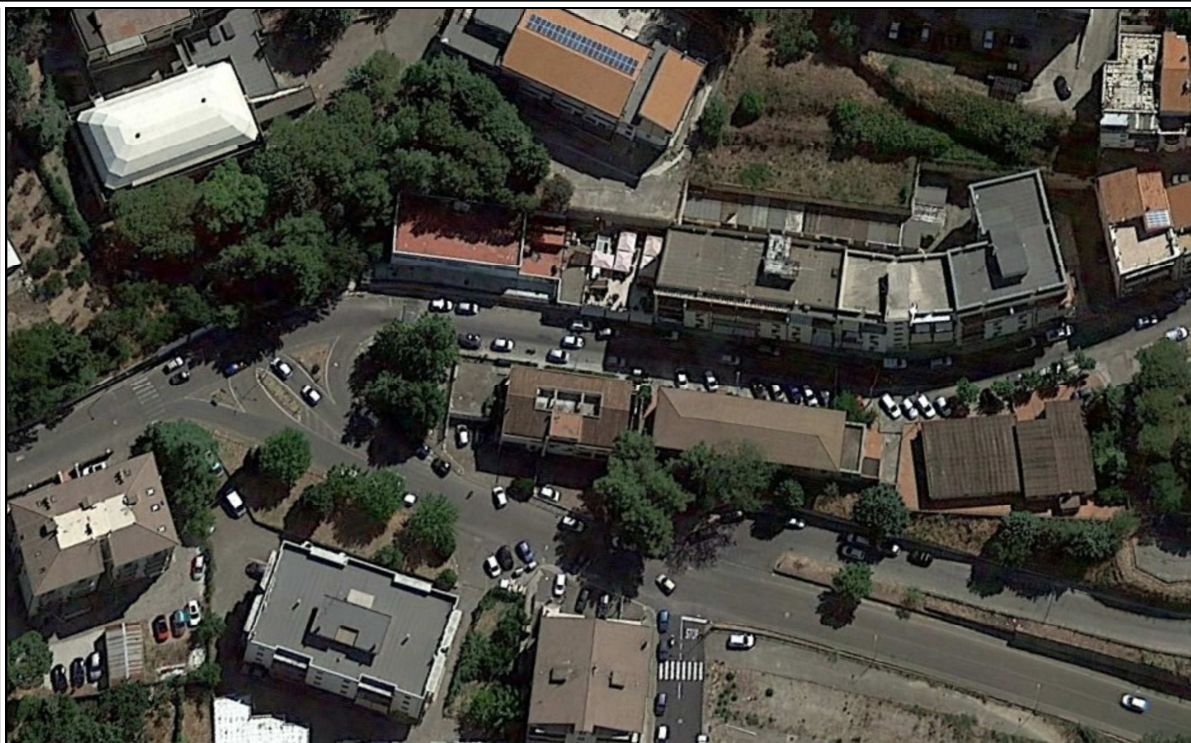

Oggetto:

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE DI FERRANDINA

Livello di definizione:

PROGETTO ESECUTIVO

Aggiornamento ai sensi del Codice degli Appalti D. Lgs. 36/2023
e al Prezzario Regione Basilicata OO.PP. 2024

Elaborato:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

agg.:

tav.:

A.08

scala:

revisione:

data:

Ottobre 2024

Progettazione:

Ing. Antonio POPOLIZIO

Spazio riservato all'ente

RUP:

Ing. Antonio Mele

N°	ATTIVITA' LAVORATIVA	DURATA	INIZIO	FINE	06/01/2025	13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	05/05/2025
					l m m g v s d	l m m g v s d	l m m g v s d	l m m g v s d	l m m g v s d	l m m g v s d	l m m g v s d	l m m g v s d	l m m g v s d	l m m g v s d	l m m g v s d	l m m g v s d	l m m g v s d	l m m g v s d	l m m g v s d	l m m g v s d	l m m g v s d	
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	2	07/01/2025	08/01/2025	<div></div>																	
2	Montaggio recinzione e apposizione segnaletica	1	07/01/2025	07/01/2025	<div></div>																	
3	Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere	1	08/01/2025	08/01/2025	<div></div>																	
4	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE, RIMOZIONI E MOVIMENTAZIONE RIFIUTI	8	09/01/2025	16/01/2025	<div></div>	<div></div>																
5	Demolizione con mezzi meccanici	1	09/01/2025	09/01/2025	<div></div>																	
6	Demolizione murature e tramezzi	1	10/01/2025	10/01/2025	<div></div>																	
7	Rimozione di intonaco ammalorato	1	11/01/2025	11/01/2025	<div></div>																	
8	Rimozione di infissi e porte interne	2	12/01/2025	13/01/2025	<div></div>																	
9	Rimozione di pavimenti	1	14/01/2025	14/01/2025	<div></div>																	
10	Fresatura conglomerato bituminoso	1	15/01/2025	15/01/2025	<div></div>																	
11	Trasporto a rifiuto	1	16/01/2025	16/01/2025	<div></div>																	
12	STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO	6	17/01/2025	22/01/2025	<div></div>	<div></div>	<div></div>															
13	Realizzazione fondazione e muro di sostegno in c.a. per rampa	6	17/01/2025	22/01/2025	<div></div>	<div></div>	<div></div>															
14	INTERVENTI DI MANUTANZIONE FABBRICATO	71	23/01/2025	03/04/2025	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
15	Taglio a sezione obbligata di muratura	2	23/01/2025	24/01/2025	<div></div>		<div></div>															
16	Tramezzi interni	2	25/01/2025	26/01/2025	<div></div>		<div></div>															
17	Interventi di riparazione e manutenzione	3	27/01/2025	29/01/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>														
18	Taglio e posa tubazioni per l'impianto idrico sanitario	2	30/01/2025	31/01/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>														
19	Realizzazione messa a terra impianti	2	01/02/2025	02/02/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>													
20	Esecuzione di massetti	3	03/02/2025	05/02/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>												
21	Intonaco interno	8	06/02/2025	13/02/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>											
22	Realizzazione cappotto	20	14/02/2025	05/03/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
23	Pavimenti e rivestimenti	4	06/03/2025	09/03/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
24	Posa infissi esterni	4	10/03/2025	13/03/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
25	Elettrico (Posa Fili, frutti, interruttori, coperchi e corpi illuminanti)	5	14/03/2025	18/03/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
26	Posa in opera sanitari e rubinetteria	2	19/03/2025	20/03/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
27	Posa infissi interni	3	21/03/2025	23/03/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
28	Tinteggiature interne	5	24/03/2025	28/03/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
29	Tinteggiature esterne	6	29/03/2025	03/04/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
30	IMPIANTI PISCINA ED ACCESSORI	1	04/04/2025	04/04/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
31	Installazione impianto di depurazione e pompaggio	1	04/04/2025	04/04/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
32	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	15	05/04/2025	19/04/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
33	Realizzazione messa a terra impianto di climatizzazione	1	05/04/2025	05/04/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
34	Esecuzione di tracce e lavori di supporto all'impianto elettrico	1	06/04/2025	06/04/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
35	Taglio e posa tubazioni per l'impianto di climatizzazione	4	07/04/2025	10/04/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
36	Posa in opera ventilconvettori	2	11/04/2025	12/04/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
37	Installazione solare termico e collaudo impianto	5	13/04/2025	17/04/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
38	Installazione pompa di calore e collaudo impianto	2	18/04/2025	19/04/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
39	INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	4	20/04/2025	23/04/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
40	Trasporto e scarico pannelli	1	20/04/2025	20/04/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
41	Installazione moduli fotovoltaici su piani predisposti	2	21/04/2025	22/04/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
42	Allaccio e messa in esercizio impianto	1	23/04/2025	23/04/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
43	MONTAGGIO RINGHIERE, RECINZIONI E CANCELLO	2	24/04/2025	25/04/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
44	Recinzioni, ringhiere e cancelli in ferro	2	24/04/2025	25/04/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
45	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE	10	26/04/2025	05/05/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
46	Cordoli marciapiedi e canalette	2	26/04/2025	27/04/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
47	Posa in opera pavimentazioni esterne	5	28/04/2025	02/05/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
48	Piantumazioni e piccoli movimenti terra	2	03/05/2025	04/05/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
49	Montaggio elementi di arredo urbano e segnaletica verticale	1	05/05/2025	05/05/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
50	CONTROLLO E COLLAUDO IMPIANTI	1	06/05/2025	06/05/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
51	Collaudo e messa in funzione impianto	1	06/05/2025	06/05/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
52	SMOBILIZZO CANTIERE	1	07/05/2025	07/05/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
53	Smontaggio apprestamenti di cantiere	1	07/05/2025	07/05/2025	<div></div>		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>

LEGENDA ZONE

Zona unica
