

PIANO DELLE INDAGINI

Lavori di consolidamento connessi ai movimenti franosi nel territorio urbano e periurbano Loc. Castelluccio

Titolo elaborato

Cronoprogramma delle indagini

Codice elaborato

F0510AR10A

Scala

-

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Progettazione



F4 ingegneria srl – Capogruppo mandataria

Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
(ing. Giorgio Zuccaro)



Società certificata secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO 14001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).

Gruppo di lavoro

Ing. Rocco Vito Enrico MISTRULLI
Ing. Giuseppina D'AGROSA GRIECO
Dott. Geol. Giuseppe PALMITESTA
Dott. For. Luigi Zuccaro
Dott.ssa Giorgia DOTOLI
Dott. Amedeo IELUZZI

Consulenze specialistiche



HYpro S.r.l. - Mandante

Via Taranto, n. 21/c - 00182 Roma
Tel: +39 0984 461376 - Fax: +39 0984 1527192
ufficiogare@hypro.it - hyprosrll@legalmail.it

Il Rappresentante Legale
(Dott. Geol. Giuseppe CERCHIARO)

Committente



Comune di Ferrandina

Piazza Plebiscito, 75013 Ferrandina (MT)
www.comune.ferrandina.mt.it

Il Responsabile dell'Area tecnica
Ing. Antonio MIELE

| Data | Descrizione | Redatto | Verificato | Approvato |
|---------------|-----------------|---------|------------|-----------|
| Dicembre 2023 | Prima emissione | BDE | Cerchiaro | GZU |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Cronoprogramma delle indagini



Cronoprogramma del Piano delle Indagini relativamente Lavori di consolidamento connessi ai movimenti franosi nel territorio urbano e periurbano Loc. Castelluccio

01/01/2024 19/01/2024 06/02/2024 24/02/2024 13/03/2024

Preparazione delle aree di cantiere (Scavo di pulizia generale dell'area di cantiere, taglio di arbusti e vegetazione, realizzazione di recinzione, accessi e viabilità di cantiere)

Apprestamenti del cantiere (Allestimento di depositi, zone di stoccaggio, servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere e recinzione)

Indagini geotecniche e prelievo campioni

Esecuzione di indagini geoelettriche

Esecuzione di indagini geognostiche con prove dinamiche


Esecuzione di prospezioni sismiche - MASW

Esecuzione di georadar

Smobilizzo del cantiere (Pulizia generale e smobilizzo)

Prove di laboratorio

Analisi ed elaborazione dati

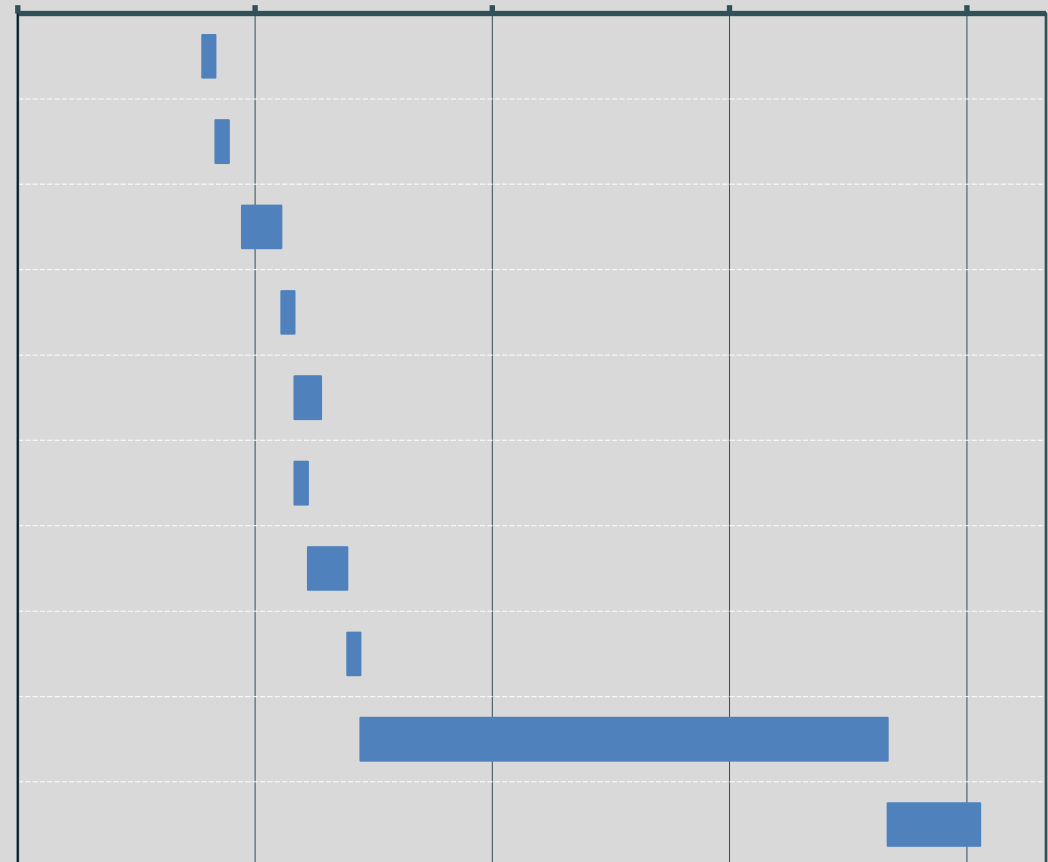

| Fase | Inizio | Fine | Durata (g) |
|--|------------|------------|------------|
| Preparazione delle aree di cantiere (Scavo di pulizia generale dell'area di cantiere, taglio di arbusti e vegetazione, realizzazione di recinzione, accessi e viabilità di cantiere) | 15/01/2024 | 16/01/2024 | 1 |
| Apprestamenti del cantiere (Allestimento di depositi, zone di stoccaggio, servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere e recinzione) | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 1 |
| Indagini geotecniche e prelievo campioni | 18/01/2024 | 23/01/2024 | 5 |
| Esecuzione di indagini geoelettriche | 23/01/2024 | 24/01/2024 | 1 |
| Esecuzione di indagini geognostiche con prove dinamiche | 24/01/2024 | 26/01/2024 | 2 |
| Esecuzione di prospezioni sismiche - MASW | 24/01/2024 | 25/01/2024 | 1 |
| Esecuzione di georadar | 25/01/2024 | 28/01/2024 | 3 |
| Smobilizzo del cantiere (Pulizia generale e smobilizzo) | 28/01/2024 | 29/01/2024 | 1 |
| Prove di laboratorio | 29/01/2024 | 07/03/2024 | 38 |
| Analisi ed elaborazione dati | 07/03/2024 | 14/03/2024 | 7 |
| | | | 60 |

