



# PROVINCIA DI MATERA

## AREA TECNICA

DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 225 del 07/05/2021

"Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'art.49 comma 95 della Legge 14 Agosto 2000, n.104, riferito al finanziamento di interventi per la sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, insistenti sulla rete viaria di Province e Città Metropolitane" – Annualità 2021



ALLEGATO

F

DISEGNO

DATA  
Febbraio 2022

SCALA

CONSOLIDAMENTO PONTE  
SUL FIUME BRADANO LUNGO  
LA S.P. 8  
"MATERA-GRASSANO"

PROGETTO UNIFICATO  
DEFINITIVO-ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica – Settore Viabilità Provincia di Matera

Il Responsabile del Procedimento  
(Arch. Carmine MINERVINO)

*Carmine Minervino*

Il Progettista  
(Arch. Carmine MINERVINO)

*Carmine Minervino*

**Provincia di Matera**

**Area Tecnica - Settore Viabilità**


# **Cronoprogramma di PROGETTO**


**OGGETTO:** DM 225 "Decreto Ponti" - Consolidamento ponte sul fiume Bradano lungo la S.P. 8

**COMMITTENTE:** Provincia di Matera

, 03/03/2022

Il Tecnico  
(Arch. Carmine Minervino)



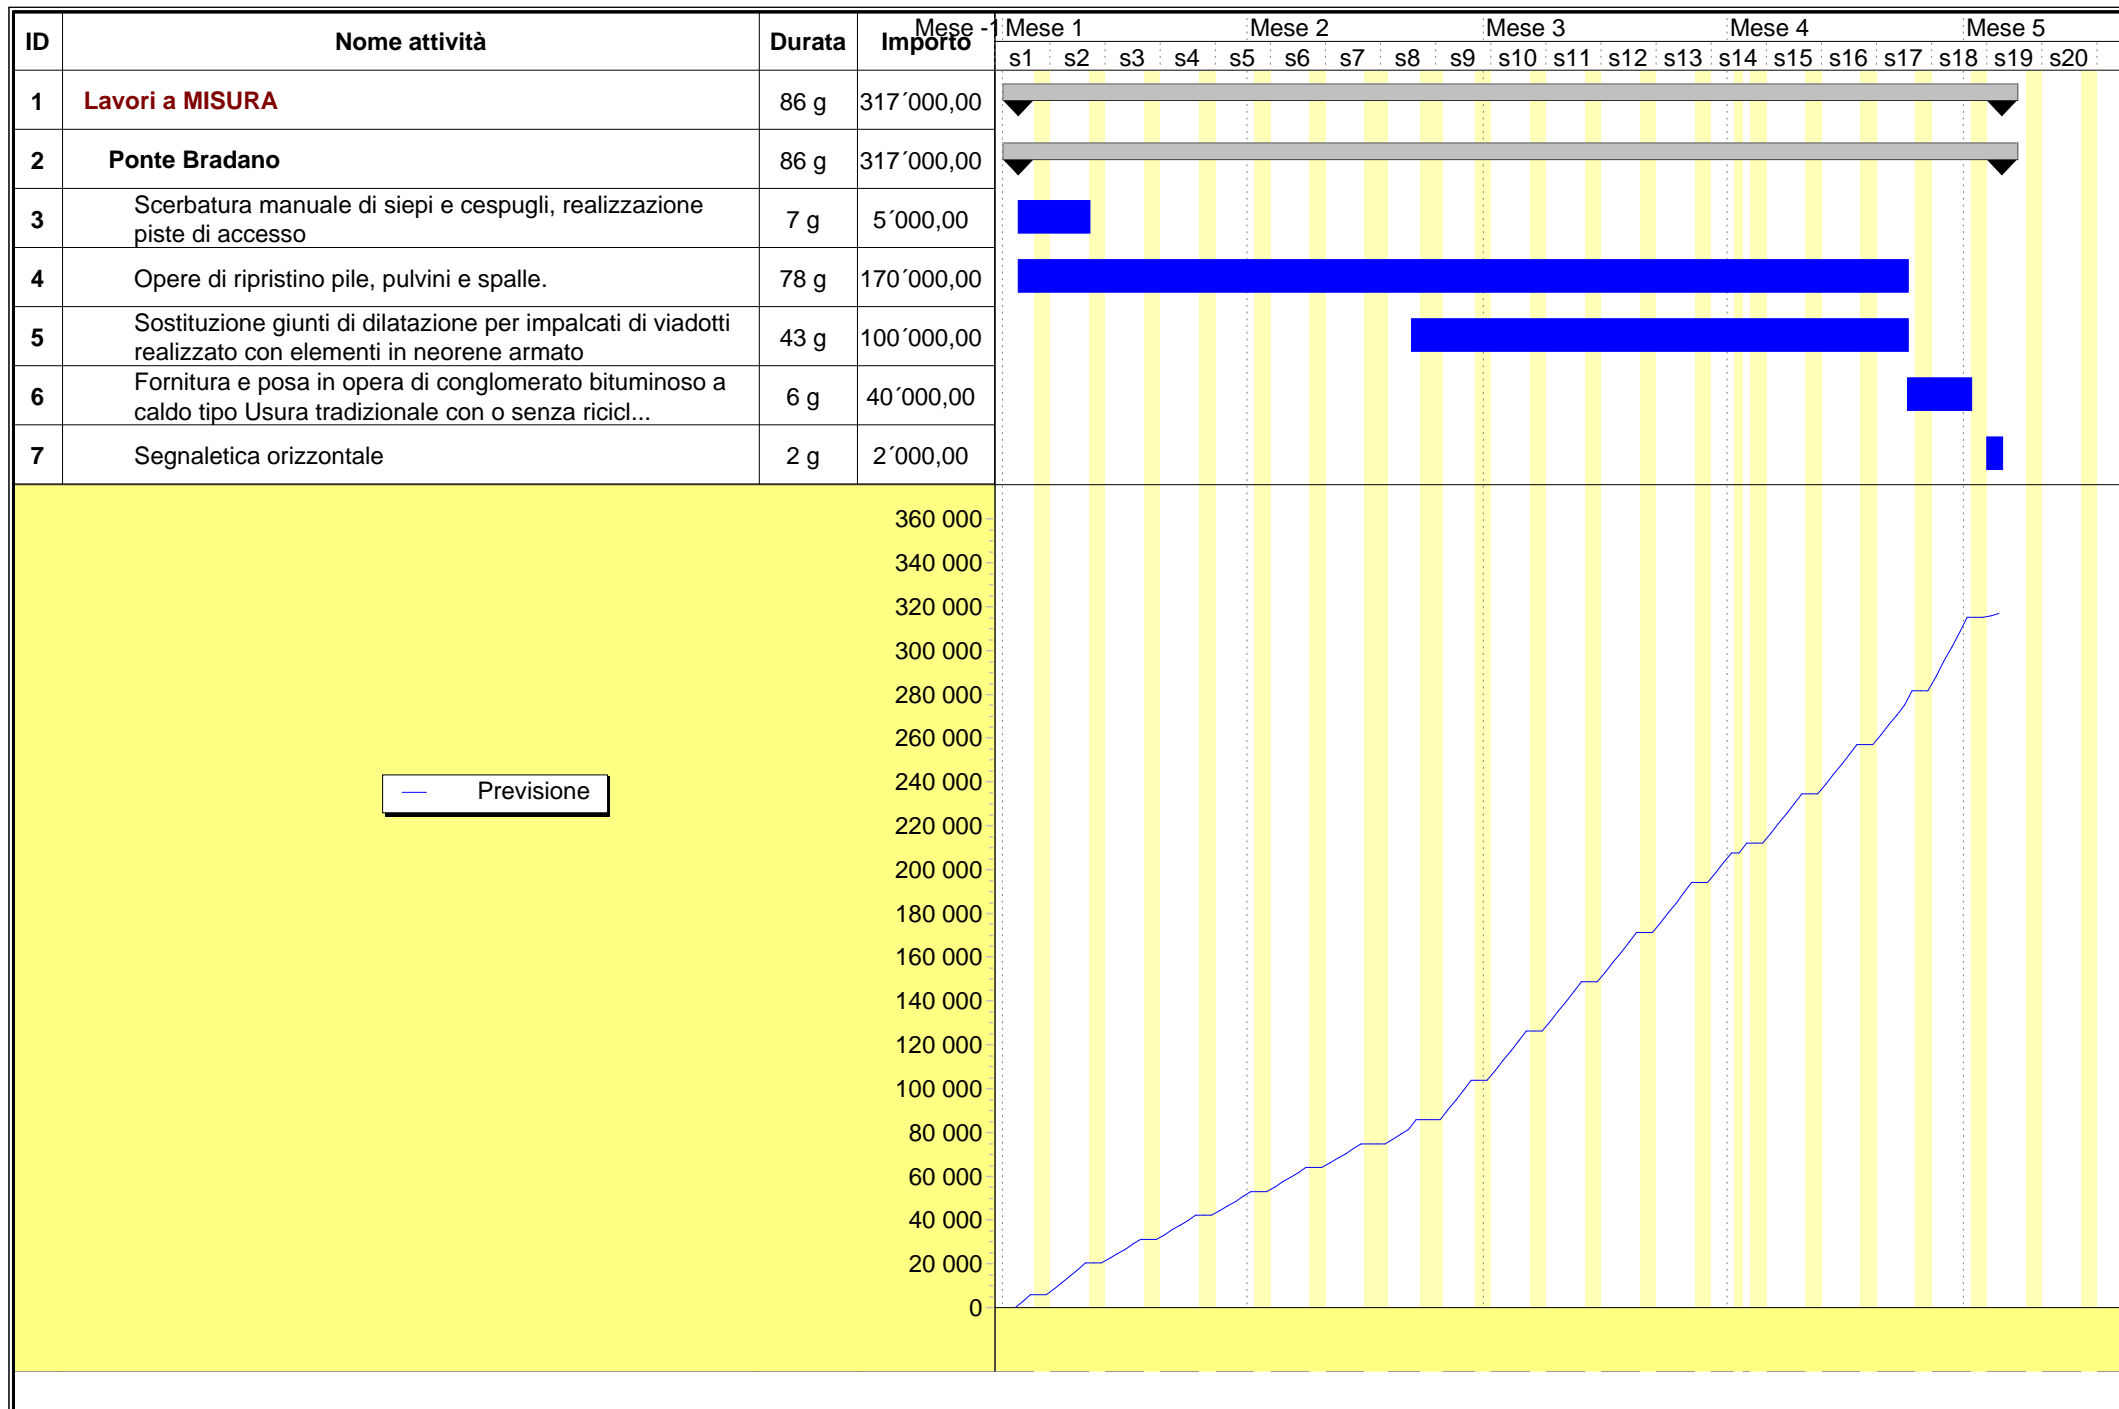

**Provincia di Matera**

**Area Tecnica - Settore Viabilità**


## **Tabella Attività**


**OGGETTO:** DM 225 "Decreto Ponti" - Consolidamento ponte sul fiume Bradano lungo la S.P. 8

**COMMITTENTE:** Provincia di Matera

, 03/03/2022

Il Tecnico  
(Arch. Carmine Minervino)



ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
<b>Lavori a MISURA</b>	<b>317'000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1 gg</b>	<b>125 gg</b>	<b>86</b>	<b>125</b>
<b>* Ponte Bradano</b>	<b>317'000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1 gg</b>	<b>125 gg</b>	<b>86</b>	<b>125</b>
* * Scerbatura manuale di siepi e cespugli, realizzazione piste di accesso	5'000,00	1,577	1 gg	9 gg	7	9
* * Opere di ripristino pile, pulvini e spalle.	170'000,00	53,628	1 gg	113 gg	78	113
* * Sostituzione giunti di dilatazione per impalcati di viadotti realizzato con elementi in neorene armato	100'000,00	31,546	51 gg	113 gg	43	63
* * Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scari	40'000,00	12,618	114 gg	121 gg	6	8
* * Segnaletica orizzontale	2'000,00	0,631	124 gg	125 gg	2	2
<p>Data, 03/03/2022</p> <p style="text-align: center;"><b>Tecnico</b> Arch. Carmine Minervino</p> <p style="text-align: center;"></p>						
