




PROVINCIA DI MATERA

SOSTITUZIONE CORONAMENTI ALLE FACCIATE DELL'I.I.S. LOPERFIDO - MATERA

CUP: H12B26003840003

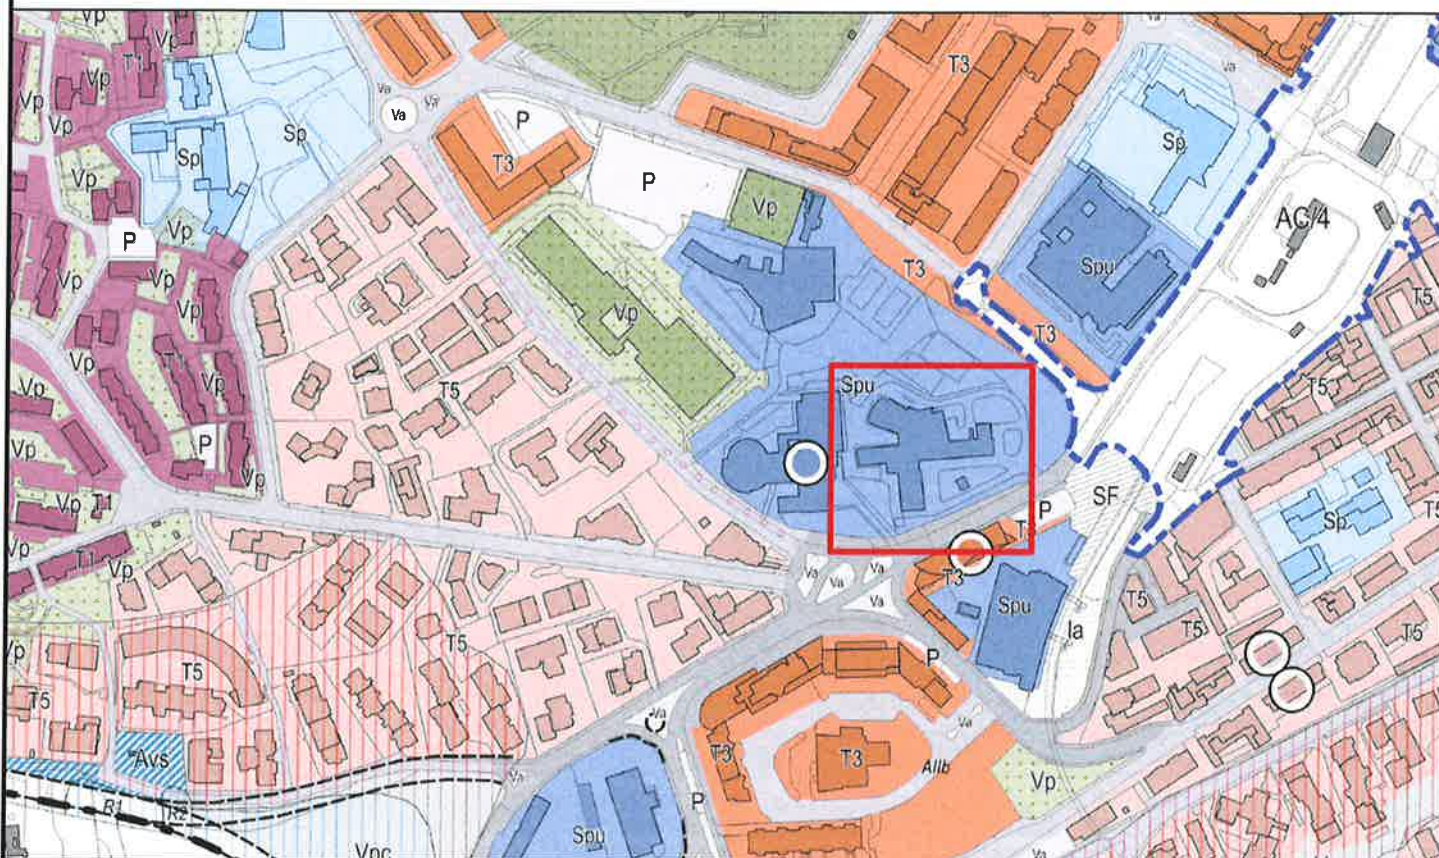

ELABORATO:

ELAB.10

DATA:

AGOSTO 2026

REVISIONE:

SCALA:

1:100

IL RUP
GEOM. ROCCO ZAFFERANO

ELABORATI GRAFICI:

- CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

NOTE:

[Handwritten signature]

PROVINCIA DI MATERA
AREA
TECNICA

ID	Nome attivita'	Durata	Importo	Mese 1							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lavori a MISURA	47 g	64'869,68								
2	Interventi sulle facciate	44 g	62'551,57								
3	Rimozione di davanzali o soglie in marmo od altra pietra ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica. v...	13 g	5'653,16								
4	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico ch ... on gli oneri come alle premesse esterno escl...	2 g	872,46								
5	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico ch ... come alle premesse orizzontale esterno escl...	1 g	437,40								
6	Risanamento corticale di piccole zone di strutture in c.a ... mida con esclusione di ponteggi. Per spessori fin...	2 g	6'435,19								
7	Sovrapprezzo all'art. precedente per applicazione del pri ... ati come all'articolo precedente per ogni ferro. v...	6 g	2'767,18								
8	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni e ... i rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. vedi voce	5 g	3'945,98								
9	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gra ... Pietra di Trani o di Apricena, Travertino, Giallo Egitto	11 g	31'844,56								
10	Fissaggio meccanico mediante tassellatura delle ornie ai ... istero per dare il lavoro finito a perfetta reg...	4 g	2'043,59								
11	Tinteggiatura con idropittura silossanica idrorepellente ... zione della pittura di fondo da computarsi a par...	7 g	8'313,75								
12	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di ... mento a discarica: per una distanza compresa ...	1 g	238,30								
13	Interventi presso aule in uso	3 g	2'318,11								
14	Fornitura e posa in opera di PARETE DIVISORIA IN CARTONGE ... 15 mm - Standard Tipo A in conform...	1 g	945,36								
15	Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o est ... e una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm. v...	1 g	337,54								
16	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo ... supporto: fondo a base di resine acriliche in f...	1 g	96,19								
17	Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile ... zione della pittura di fondo da computarsi a par...	1 g	475,20								
18	Porta per interni in acciaio, con battente costituito da ... e 2 cerniere. Porta per interni in acciaio spessore...	1 g	463,82								
			75 000								
			70 000								
			65 000								
			60 000								
			55 000								
			50 000								
			45 000								
			40 000								
			35 000								
			30 000								
			25 000								
			20 000								
			15 000								
			10 000								
			5 000								
			0								

— Previsione

